One Platform

คู่มือการใช้งาน

ระบบบริหารงานขาย ส่งมอบโครงการ และ MA

สำหรับ DT SBU — Solution Manager, ผู้บริหาร, PMO, PM, ทีมพัฒนา, OPN, ทีม MA และ Call center

ฉบับที่ 1.1 · 10 พฤศจิกายน 2569

ภาพหน้าจอจากต้นแบบ — ข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่าง

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ

2. โครงสร้างเมนู

3. เริ่มต้นใช้งาน

4. งานของฉัน (ทุกบทบาท)

5. ฝ่ายขาย (Solution Manager)

6. ผู้บริหาร (Executive)

7. หัวหน้ากลุ่ม

8. PMO และ Project Manager

9. ทีมพัฒนา (SA · BA · UX/UI · Dev · DevOps · QA)

10. ทีม MA และ Call center

11. OPN (จัดซื้อและการเงิน)

12. ผู้ดูแลระบบ

13. ภาคผนวก

1 ภาพรวมระบบ

One Platform คือระบบกลางของ DT SBU ที่ดูแลโครงการตั้งแต่ **ได้โอกาสขายครั้งแรก** จนถึง **ต่อสัญญา MA** ในที่เดียว ทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน แต่แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูและโครงการที่เกี่ยวกับงานของตัวเอง เอกสารทั้งหมดเก็บใน SharePoint ของโครงการ และการแจ้งเตือนส่งผ่านกระดิ่งในระบบ อีเมล และ Microsoft Teams

วงจรงานของโครงการ

1 · ก่อนขาย

SM ลงทะเบียน เก็บ Requirement ทำ Cost Sheet / ใบเสนอราคา / TOR / Proposal

2 · อนุมัติ

หัวหน้ากลุ่มตรวจ TOR · รองผู้บริหาร → ผู้บริหารอนุมัติราคา

3 · ประมูล / ปิดการขาย

Sale ยื่น SM บันทึกผล · Close Win / Close Lose

4 · Handover

PMO มอบหมาย PM · ประชุม 5 ฝ่าย · เงื่อนไขสัญญา

5 · ส่งมอบ

PM และทีมพัฒนาทำงานใน Project Workspace · งวดงาน · ตรวจรับ

6 · ประกันและ MA

ทีม MA รับมอบ · รายงาน Preventive Maintenance · Service Desk · ต่อสัญญา

สถานะของโครงการ

สถานะ	ความหมาย	ใครย้ายได้
Opportunity (10–20%)	มีโอกาสขาย ยังไม่ชัด	SM
Pipeline (40–50%)	ลูกค้าเริ่มเจรจา ต้องมีลูกค้า ทีม และ Sale	SM
Forecast (70–80%)	ตกลงขอบเขตแล้ว ต้องมีราคาที่อนุมัติ + TOR ที่หัวหน้าตรวจผ่าน + Proposal	SM
Rebidding	ประมูลภาครัฐ ต้องมีเลข e-GP และราคากลาง	SM
Close Win / Close Lose	ผลการขาย (แพ้ต้องระบุเหตุผล คู่แข่ง ราคา)	SM
Handover	ส่งต่องานให้ PM	PMO / หัวหน้า
In Delivery	กำลังส่งมอบ	PM / PMO
Warranty	อยู่ในระยะประกัน	ทีม MA รับมอบ
Ended / Cancelled	ปิดโครงการ / ยกเลิก	MA / หัวหน้า

2 โครงสร้างเมนู

เมนูด้านซ้ายจัดตามลำดับการทำงาน — หมวด **Executive** เป็นของผู้บริหาร DT (รองผู้บริหารและผู้บริหาร) เท่านั้น ส่วนผู้ปฏิบัติงานเริ่มจาก **งานของฉัน** ตามด้วย **ข้อมูลกลาง** แล้วไล่ตามวงจรโครงการ **ก่อนขาย → ส่งมอบ → ประกันและ MA** ปิดท้ายด้วยการเงินและผู้ดูแลระบบ แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูที่ใช้

หมวด	เมนู	ใช้ทำอะไร
Executive · ผู้บริหาร DT	Executive Dashboard	ทุกทีมเทียบเป้า: คน Workload โครงการ ยอดชนะ
	Project Status Tracker	สถานะละเอียดทุกโครงการ 9 ขั้น ตั้งแต่รอ Sale ยื่นจนถึง MA
	Mail Inbox	อีเมลขออนุมัติจาก Microsoft 365 — Approve / Reject ในระบบ
My Work · งานของฉัน	My Tasks	งานที่ได้รับมอบหมายทุกโครงการ สร้างงาน แจ้งลา Timesheet
	Approval Requests	คิวของหัวหน้ากลุ่ม: TOR Final รอตรวจ และคำขอที่ติดตาม
	Calendar	ปฏิทินกลาง: วันหยุด การลา ประชุม งวดงาน รอบ PM วันหมดประกัน
	My Performance	ชั่วโมงทำงาน OT และงานที่เสร็จของตัวเอง
Projects & Customers · ข้อมูลกลาง	Project Register	ทะเบียนโครงการทุกสถานะ — จุดเริ่มต้นเปิดดูโครงการใดก็ได้
	Customer Accounts	ทะเบียนลูกค้าและหน่วยงานผู้ใช้
Sales · ก่อนขาย (หมวดแรก)	SM Dashboard	ยอดปิดเทียบเป้าที่ SM ตั้งเอง Pipeline และกำหนดการใกล้ถึง — SM เห็นเฉพาะของตัวเอง
	Project Register	ทะเบียนโครงการ มุมมองรายการและ Pipeline + ปุ่มลงทะเบียนโครงการใหม่ (เริ่มที่ Opportunity)
	Solution Catalog	โซลูชันสำเร็จรูปที่ขายซ้ำได้
Delivery · ส่งมอบโครงการ	Project Overview	ภาพรวมทุกโครงการที่กำลังส่งมอบ (PMO / หัวหน้า)
	Project Workspace	พื้นที่ทำงานของ PM และทีม: งาน บอร์ด งวดงาน ความเสี่ยง ผู้ติดต่อ
	Resource Workload	ภาระงานของทีม การลา และคำขอคน
After-Sales · ประกันและ MA	Warranty & Maintenance	รับมอบเข้าประกัน รอบรายงาน PM ต่อสัญญา MA


หมวด	เมนู	ใช้ทำอะไร
	Service Desk	Ticket แจ้งปัญหา และ SLA
Finance · จัดซื้อและการเงิน	Purchase Requisitions	คำขอซื้อในงบ Cost Sheet และการอนุมัติเบิกจ่าย
	Bank Guarantees	หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
Admin · ผู้ดูแลระบบ	System Settings	สิทธิ์ ลำดับอนุมัติ ปฏิทิน เวลาทำงาน การแจ้งเตือน Audit log

เคล็ดลับ หน้าโครงการ (เปิดจาก Project Register) คือ “แฟ้มโครงการ” สำหรับทุกฝ่าย ส่วน Project Workspace คือ “โต๊ะทำงาน” ของ PM และทีมพัฒนา — หน้าโครงการมีปุ่มลัดไป Workspace (บอร์ดงาน งวดงาน ความเสี่ยง) เสมอ

3 เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ

1. เปิด One Platform แล้วกด **เข้าสู่ระบบด้วย Microsoft** ใช้บัญชี Microsoft 365 ของบริษัท
2. ระบบเปิดเมนูตามตำแหน่งงานของคุณ (กำหนดใน Microsoft Entra ID) และพาไปหน้าแรกของบทบาท

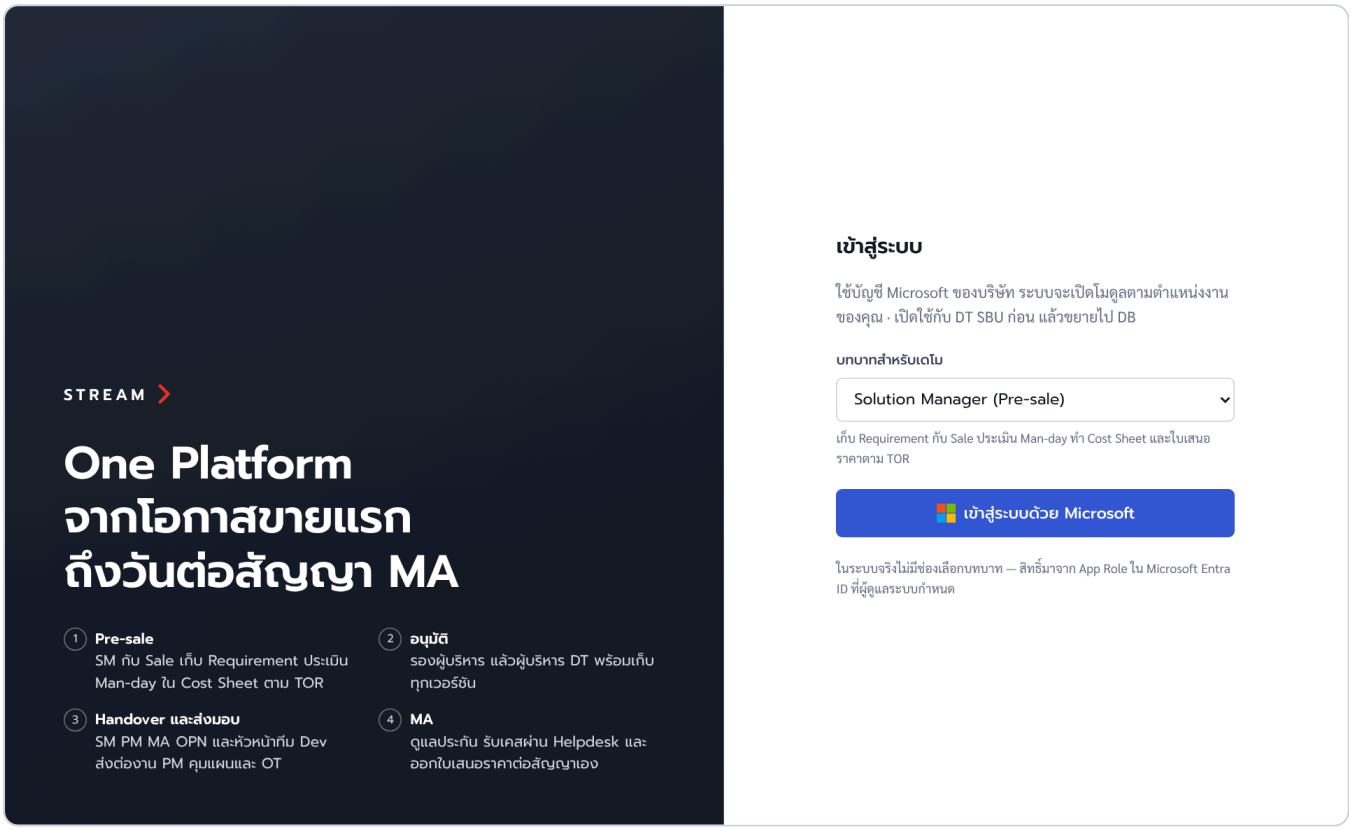


หน้าเข้าสู่ระบบ (ต้นแบบมีช่องเลือกบทบาทและบัญชีทีมพัฒนาสำหรับเดโม)

> **หมายเหตุ** ในต้นแบบ เลือก “บทบาทสำหรับเดโม” ได้ ถ้าเลือกทีมพัฒนาจะมีช่องเลือกบัญชีรายคน (SA, BA, UX/UI, Front-end, Back-end, DevOps, QA) ระบบจริงไม่มีช่องนี้

แถบด้านบน

ส่วน	การใช้งาน
ตำแหน่งหน้า	บอกว่าอยู่หมวดไหน เมนูอะไร
ค้นหา (Ctrl + K)	พิมพ์ชื่อเมนู ชื่อโครงการ หรือรหัสงาน เช่น SPP-5 แล้วกด Enter
ปุ่มพระจันทร์ / พระอาทิตย์	สลับธีมสว่าง / มืด
กระดิ่ง	การแจ้งเตือน (ตัวเลขแดง = ยังไม่อ่าน) คลิกเพื่อไปหน้าที่เกี่ยวข้อง
ชื่อมุมขวา	ธีม ออกจากระบบ (ต้นแบบ: สลับบทบาทเดโม)

ส่วน	การใช้งาน
ย่อเมนู (ล่างซ้าย)	ย่อแถบเมนูเหลือไอคอน

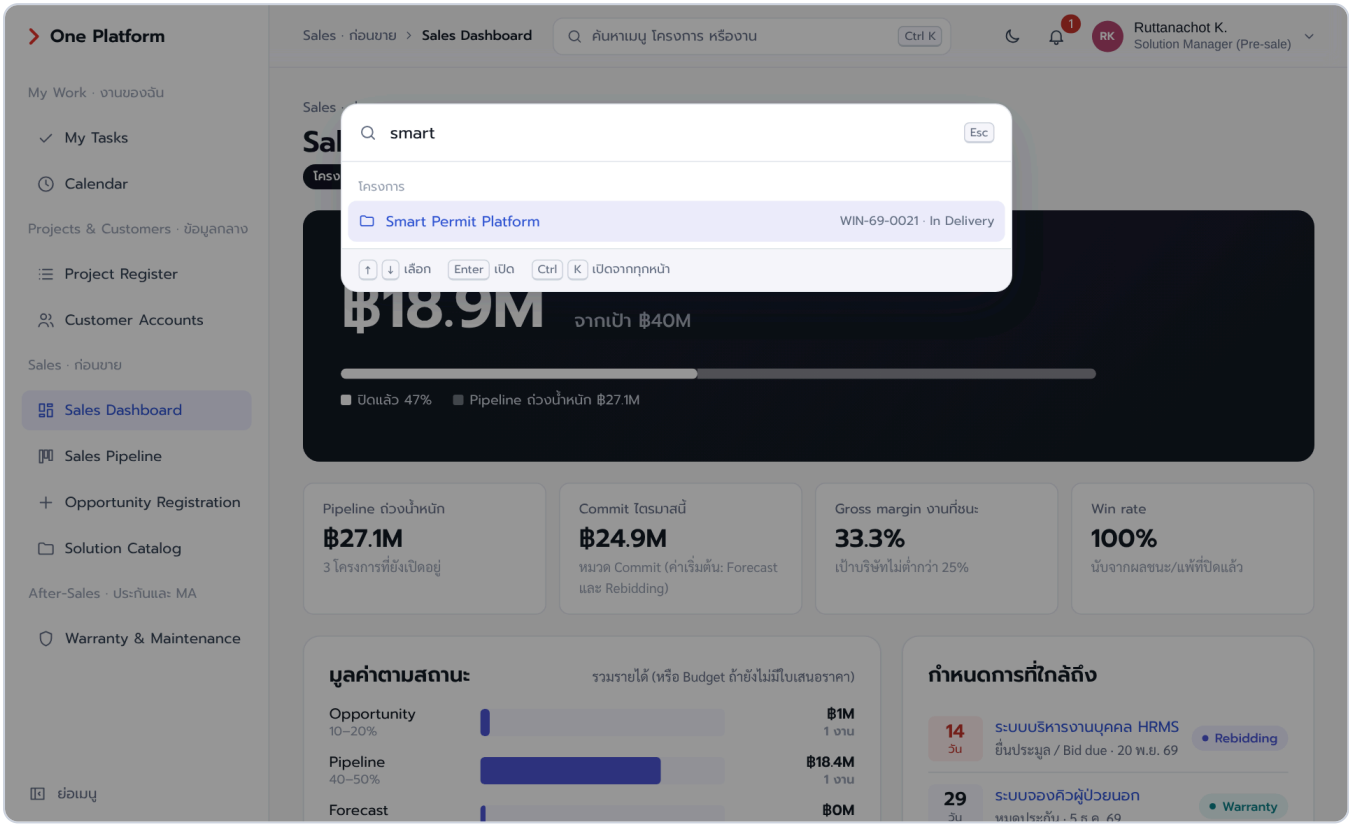


ค้นหาด่วนด้วย Ctrl + K

4 งานของฉัน (ทุกบทบาท)

My Tasks


งานทุกชิ้นที่คุณรับผิดชอบหรือร่วมทำจากทุกโครงการ แบ่งเป็น **เลยกำหนด / ครบกำหนดใน 7 วัน / ถัดไป / ยังไม่กำหนดวัน** เปลี่ยนสถานะได้ทันทีจากรายการ คลิกชื่องานเพื่อเปิดรายละเอียด

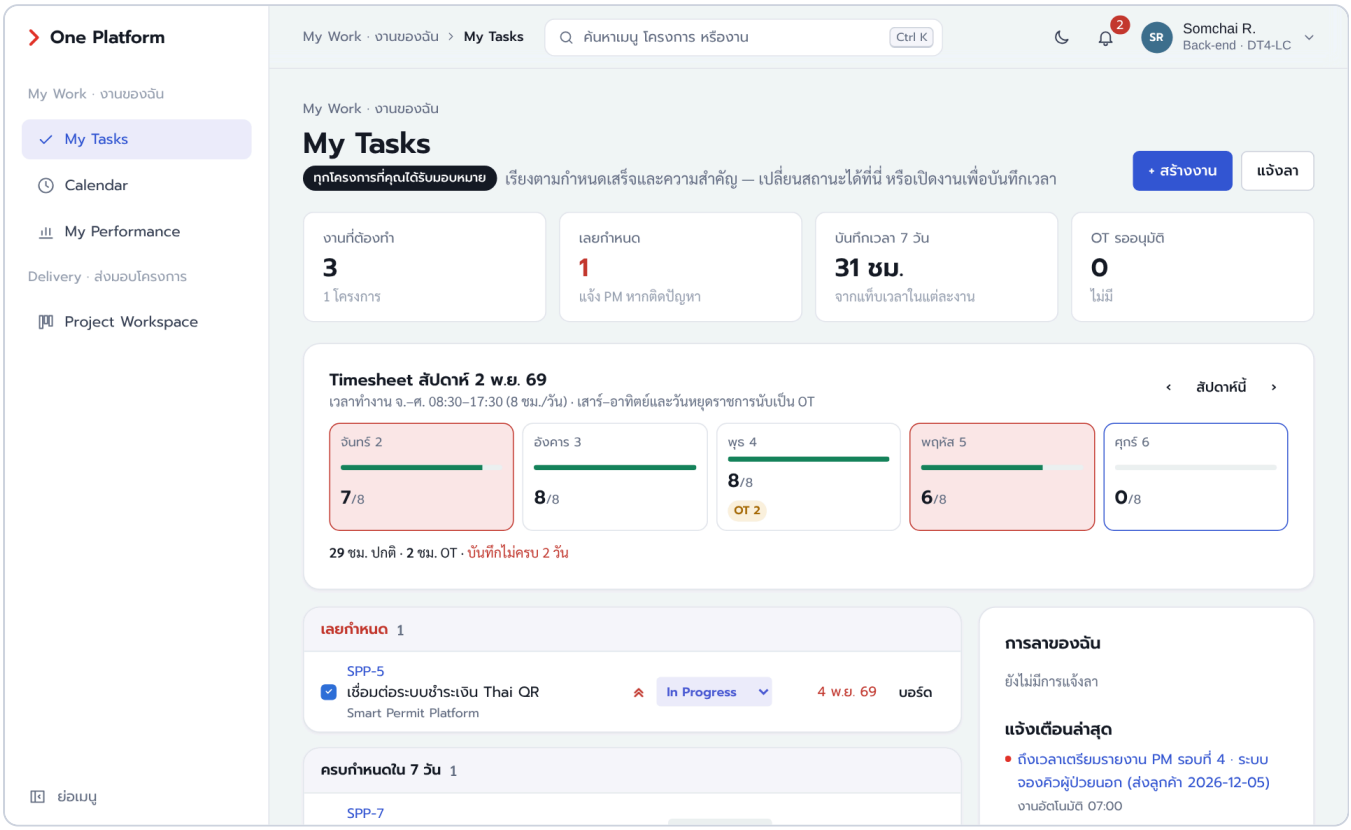

My Tasks: Timesheet สัปดาห์นี้ งานที่ต้องทำ การลา และการแจ้งเตือน

สร้างงานของตัวเอง

1. กด **+ สร้างงาน** ที่มุมขวาบนของ My Tasks
2. เลือกโครงการ ตั้งชื่องาน ประเภท ความสำคัญ วันครบกำหนด (และงวดงานถ้ามี)
3. กด **สร้างงาน** — งานถูกมอบหมายให้คุณทันทีและขึ้นในรายการ

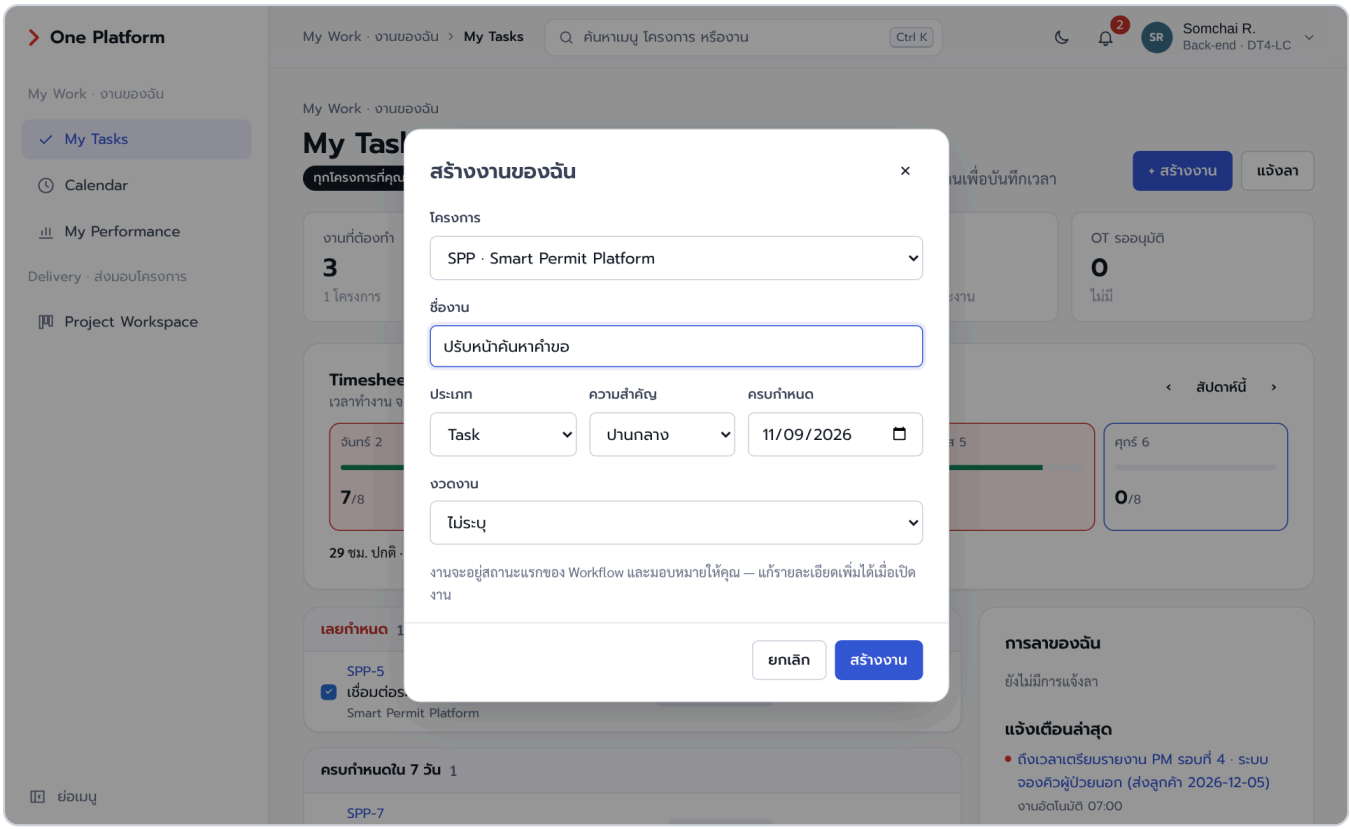


สร้างงานของฉัน

> **เคล็ดลับ** ปุ่ม + สร้างงาน แสดงเมื่อคุณเป็นสมาชิกของพื้นที่งานอย่างน้อย 1 โครงการ ถ้ายังไม่เป็น ให้ PM เพิ่มในแท็บ Settings ของพื้นที่งาน

แจ้งลา


ใช้แจ้งทีมและ PM ว่าคุณไม่อยู่วันไหน และงานใดได้รับผลกระทบ (ยังต้องยื่นลาในระบบ HR ตามปกติ)

1. กด **แจ้งลา** เลือกวันที่ เต็มวันหรือครึ่งวัน ประเภทการลา
2. ระบบแสดงงานที่ช่วงเวลาทับวันลา งานที่ครบกำหนดระหว่างลาต้องเลือกวิธี: **ทำเสร็จก่อนลา / ขอเลื่อนวันส่ง / ขอให้ PM ส่งต่อ**
3. กด **บันทึกการลา** — PM ได้รับแจ้งเตือน และ Log การลาบันทึกไว้

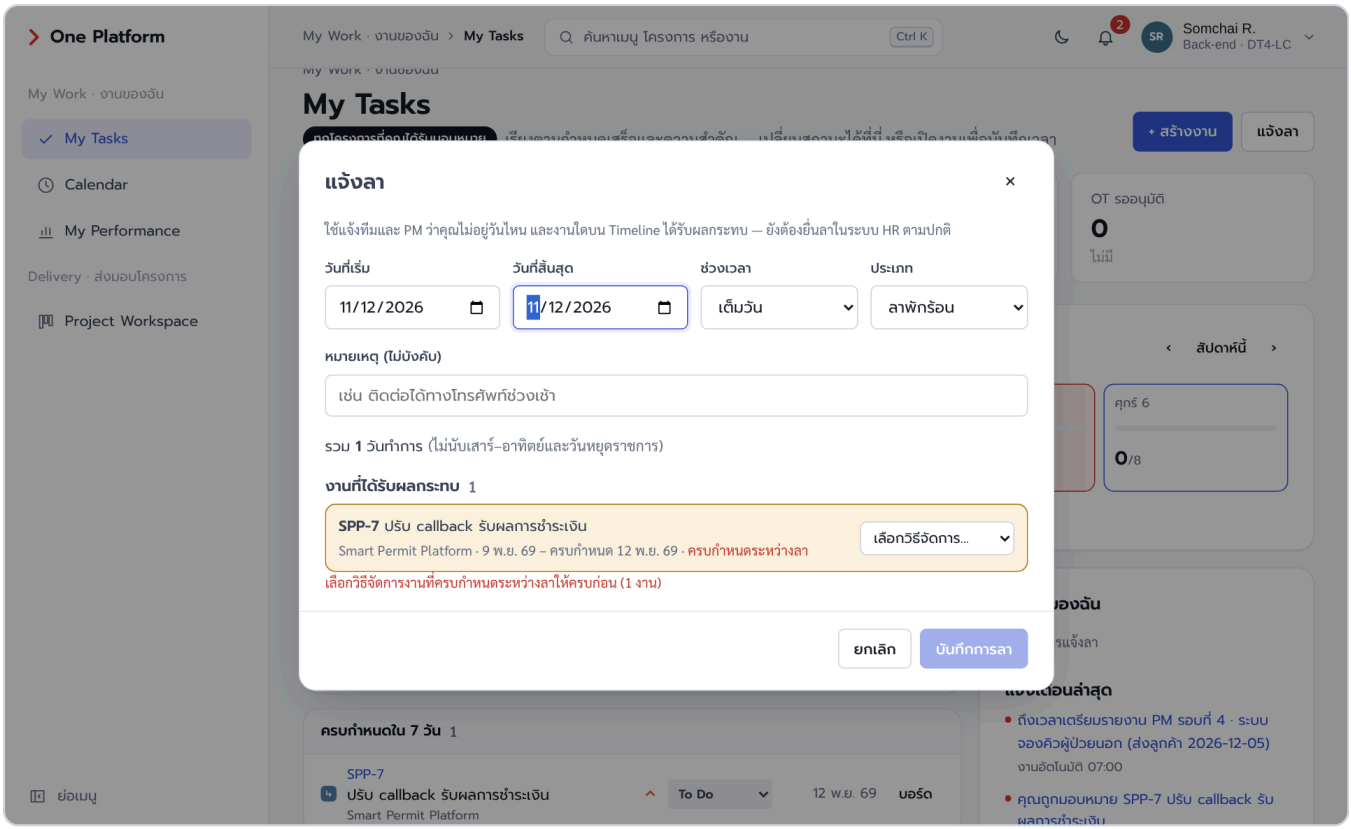


แจ้งลาและตรวจผลกระทบกับงาน

Calendar และ My Performance

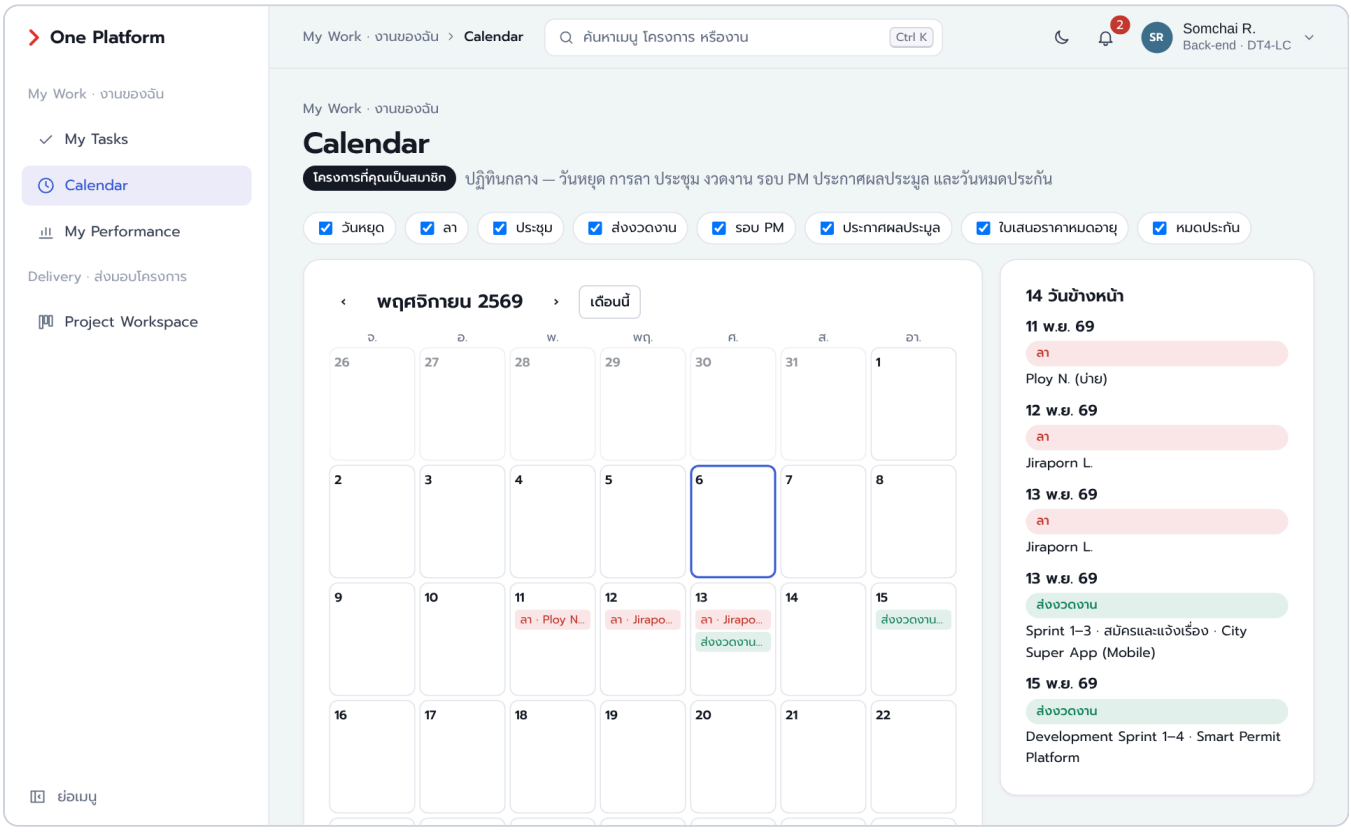

Calendar: ปฏิทินกลาง กรองตามประเภทเหตุการณ์ได้

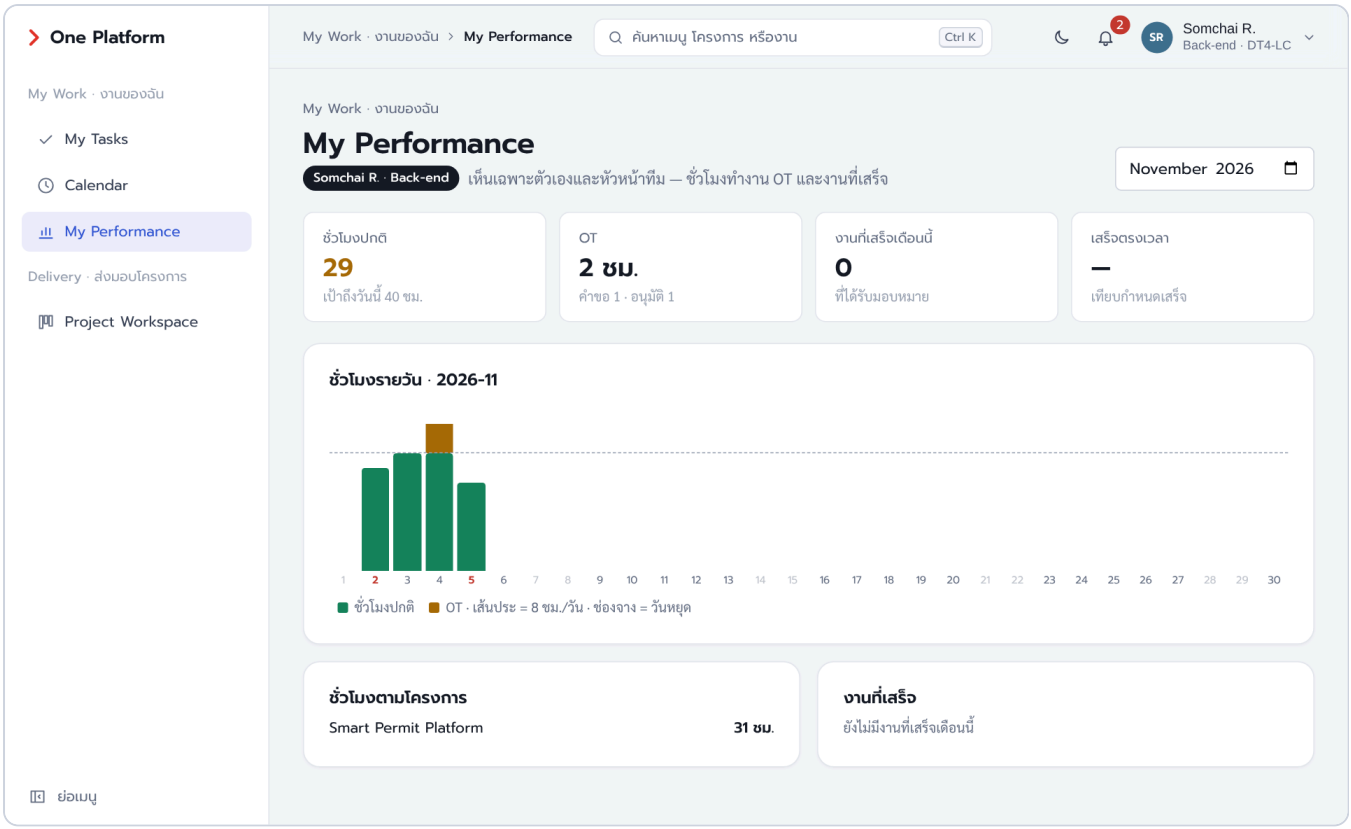


My Performance: ชั่วโมงรายวันเทียบ 8 ชม. และงานที่เสร็จตรงเวลา

5 ฝ่ายขาย (Solution Manager)

1. ลงทะเบียนโอกาสขาย


1. เมนู **Project Register › ลงทะเบียนโครงการใหม่**
2. เลือกแหล่งที่มา: **ลูกค้ามีโอกาสจ้าง** หรือ **ทีมคิด Product เอง** (เลือกจาก Solution Catalog ระบบเติมชื่อ ทีม ราคา และ Proposal ตั้งต้นให้)
3. กรอกลูกค้า ประเภทโครงการ ทีมเจ้าของ งบประมาณ และ Sale ที่ทำงานคู่กัน แล้วบันทึก — ระบบออกรหัสและสร้างโฟลเดอร์ SharePoint

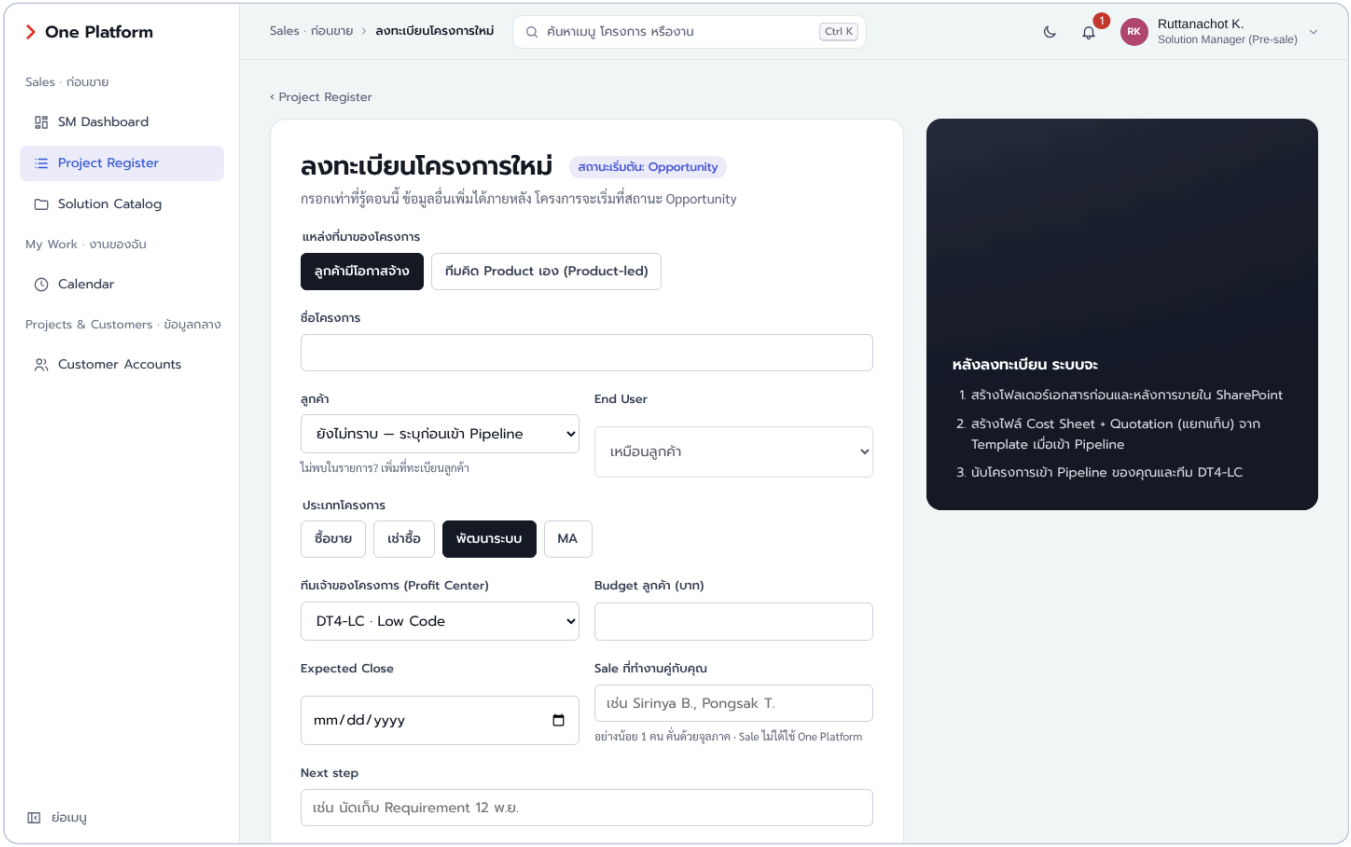

ลงทะเบียนแบบ Product-led จาก Solution Catalog

2. หน้าโครงการ


เปิดจาก **Project Register** แถบบนแสดงสถานะและปุ่มย้ายสถานะ แถบความคืบหน้าแสดงตำแหน่งในวงจร แท็บด้านล่างแบ่งงานตามช่วง

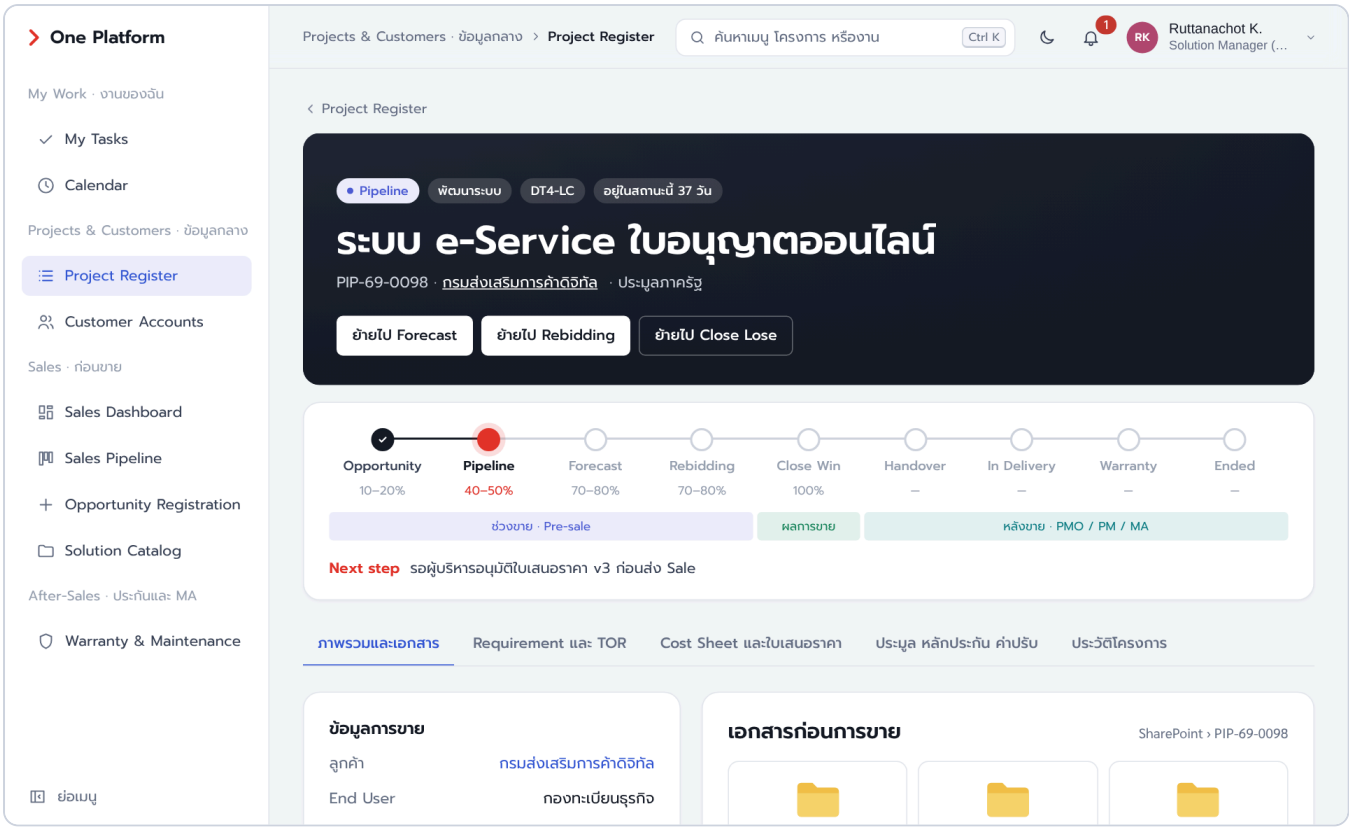

หน้าโครงการ: สถานะ ปุ่มย้ายสถานะ และแท็บ

3. Requirement และ TOR


1. แท็บ **Requirement และ TOR** — กรอก Requirement Overview และ Process การใช้งาน บันทึกประชุมกับลูกค้า
2. แนบ **TOR Final** แล้วกด **ส่งหัวหน้ากลุ่มตรวจ** (ส่งลูกค้าได้หลังผ่านเท่านั้น)
3. กด **สร้างจาก Template** เพื่อสร้าง Proposal
4. กล่อง “พร้อมเข้า Forecast” บอกว่ายังขาดอะไร

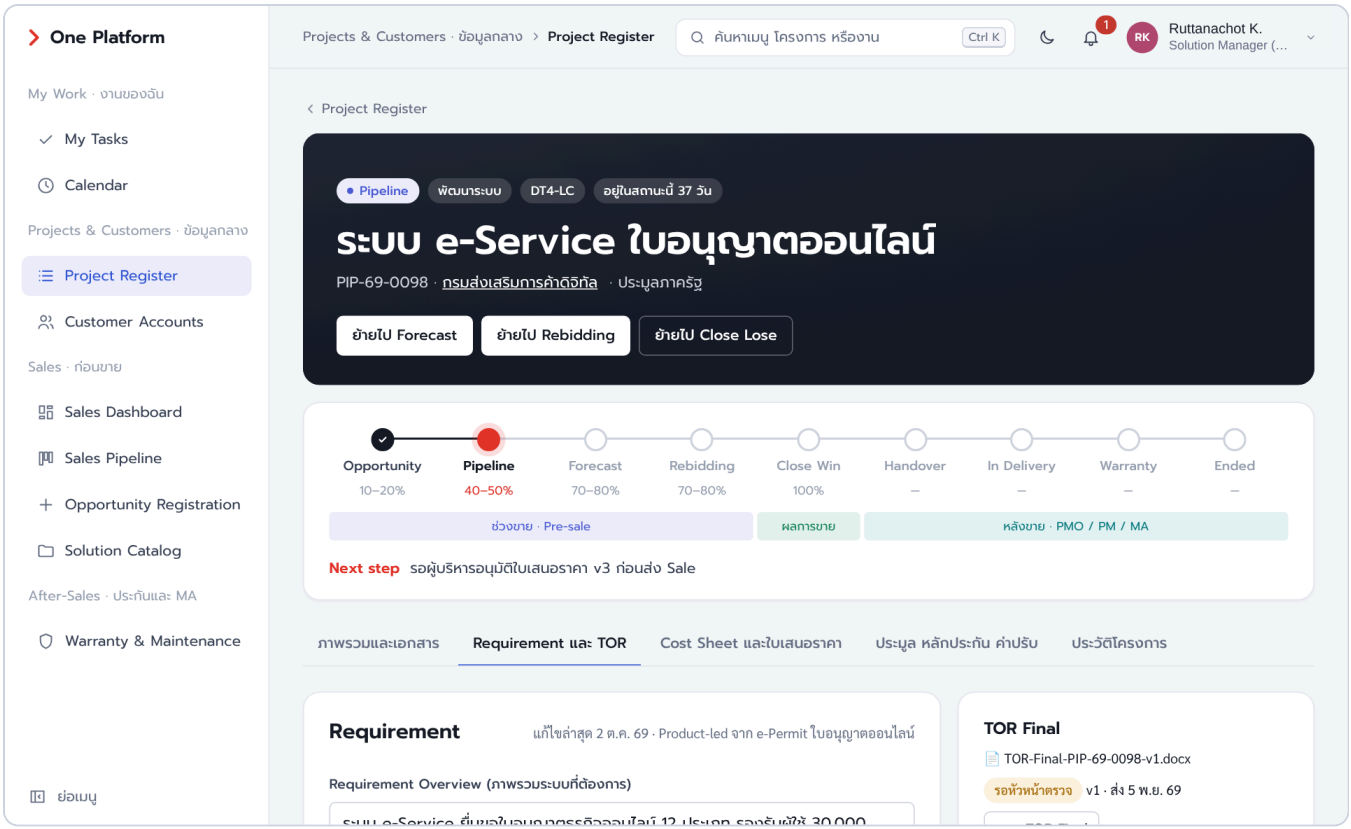

Requirement, TOR Final และ Proposal

4. Cost Sheet และขออนุมัติราคา

1. แท็บ **Cost Sheet และใบเสนอราคา** — เปิด Excel Online (ไฟล์เดียว แยกแท็บ Cost Sheet / Quotation)
2. นัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร แล้วกด **ส่งขออนุมัติ** บันทึกวันที่ ผู้เข้าประชุม และสรุปผล (บังคับ) ระบบล็อกตัวเลขที่ส่ง (Snapshot) และส่งอีเมลถึงรองผู้บริหาร แล้วผู้บริหาร
3. ถ้าถูกส่งกลับ ระบบบอกว่าต้องแก้เอกสารใด แก้แล้วส่งเป็นเวอร์ชันใหม่
4. อนุมัติแล้ว ใบเสนอราคาใช้ได้ 60 วัน ระบบเตือนก่อนหมดอายุ 14 วัน

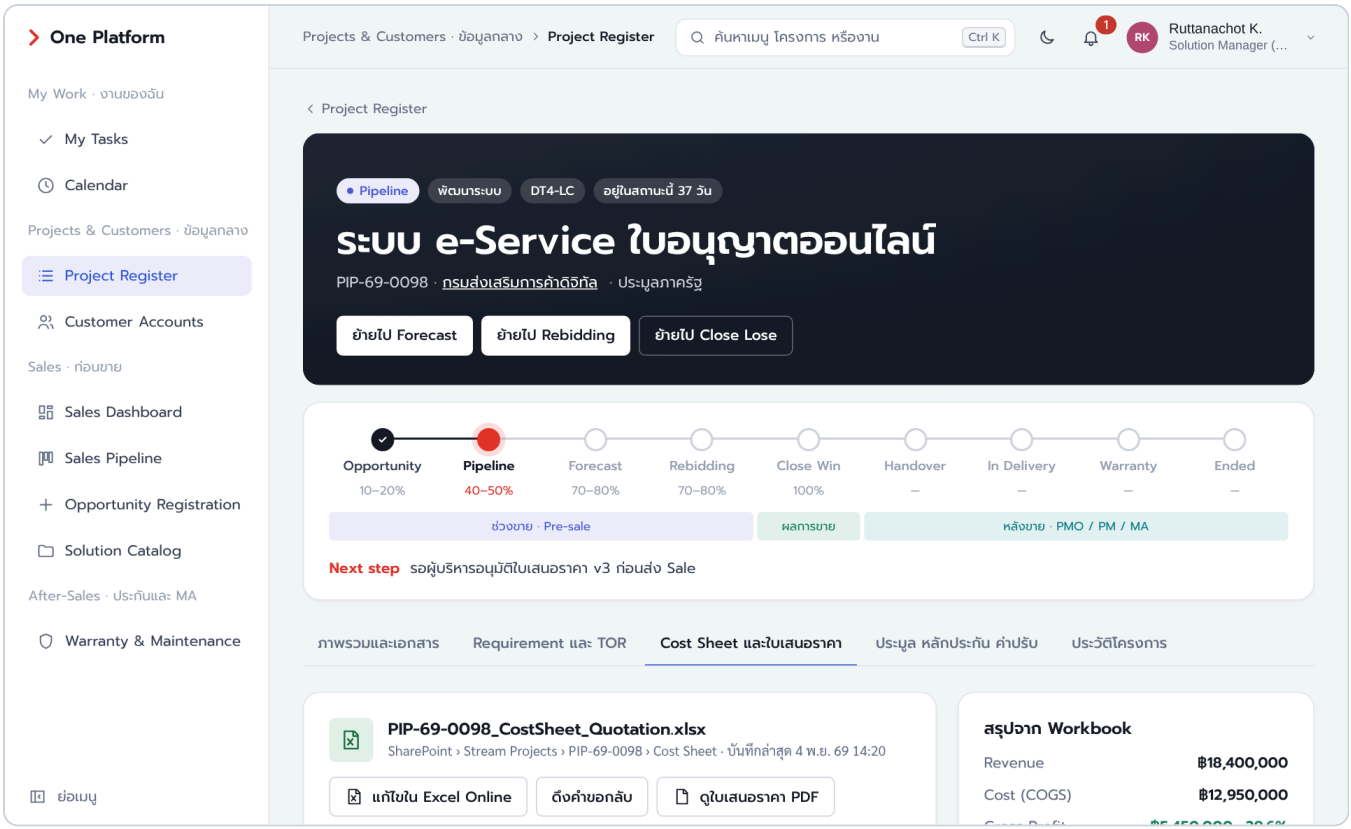


Cost Sheet และสถานะการอนุมัติ


> **กฎของระบบ** ถ้าแก้ไฟล์ Excel หลังส่งขออนุมัติ คำขอจะถูกยกเลิก (Stale) ต้องส่งใหม่ — ผู้บริหารอนุมัติตามตัวเลขที่ถูกล็อกเท่านั้น

5. ย้ายสถานะ ประมูล และบันทึกผล

1. กดปุ่มย้ายสถานะบนหน้าโครงการ หรือลากการ์ดใน **Project Register › Pipeline** — ระบบแสดงสิ่งที่ยังขาดถ้าไม่ผ่านเงื่อนไข
2. งานประมูลภาครัฐ: บันทึกเลข e-GP ราคากลาง ราคาที่ยื่น และ **วันคาดว่าประกาศผล** ในแท็บประมูล (ระบบเตือนล่วงหน้า 1 วัน)
3. Sale แจ้งผล → SM กด Close Win (แนบประกาศผู้ชนะ + PO/สัญญา) หรือ Close Lose (ระบุเหตุผล คู่แข่ง ราคา)
4. หลังชนะ กด **แจ้งทีมพัฒนา + ขอ PM** ในแท็บ Handover

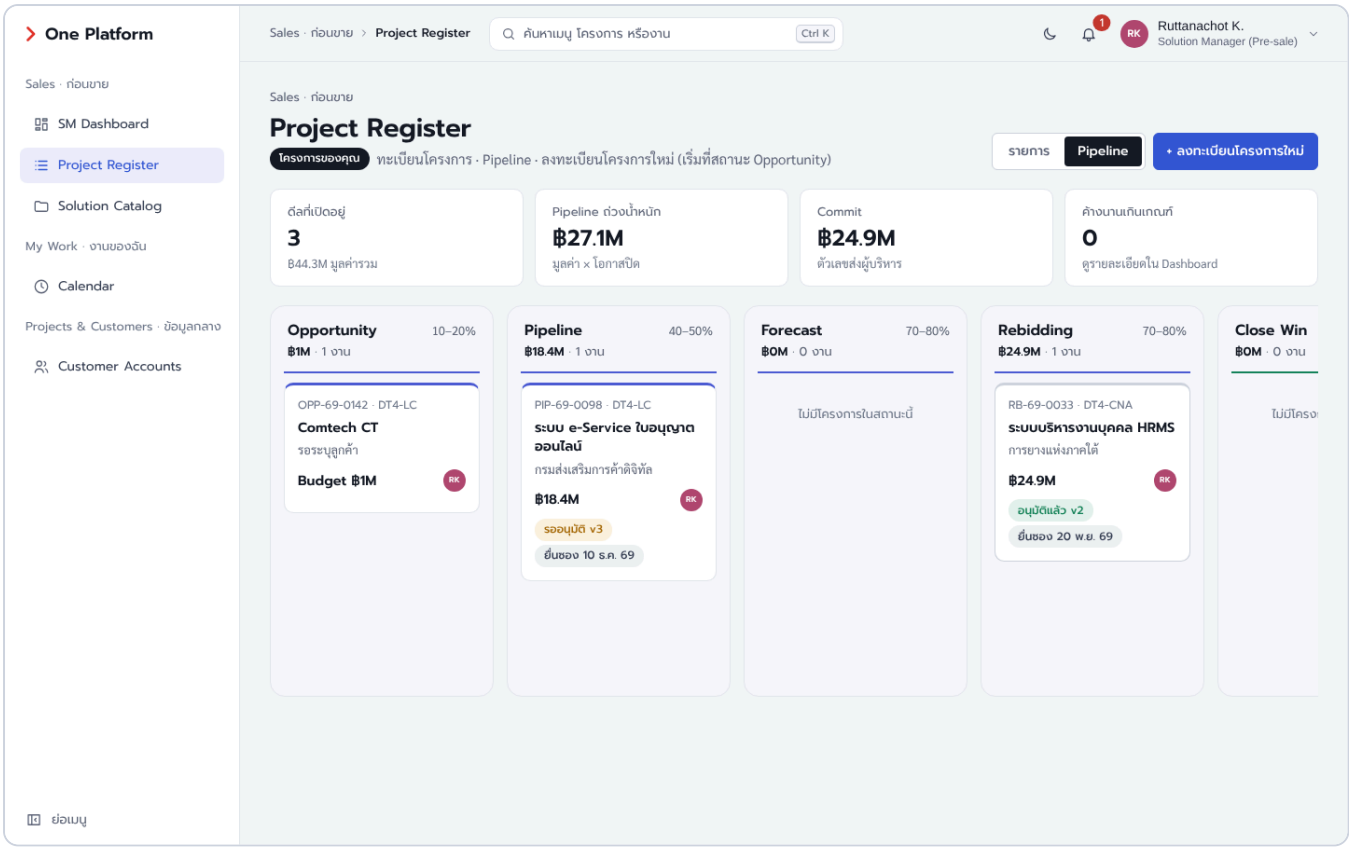


Project Register › Pipeline

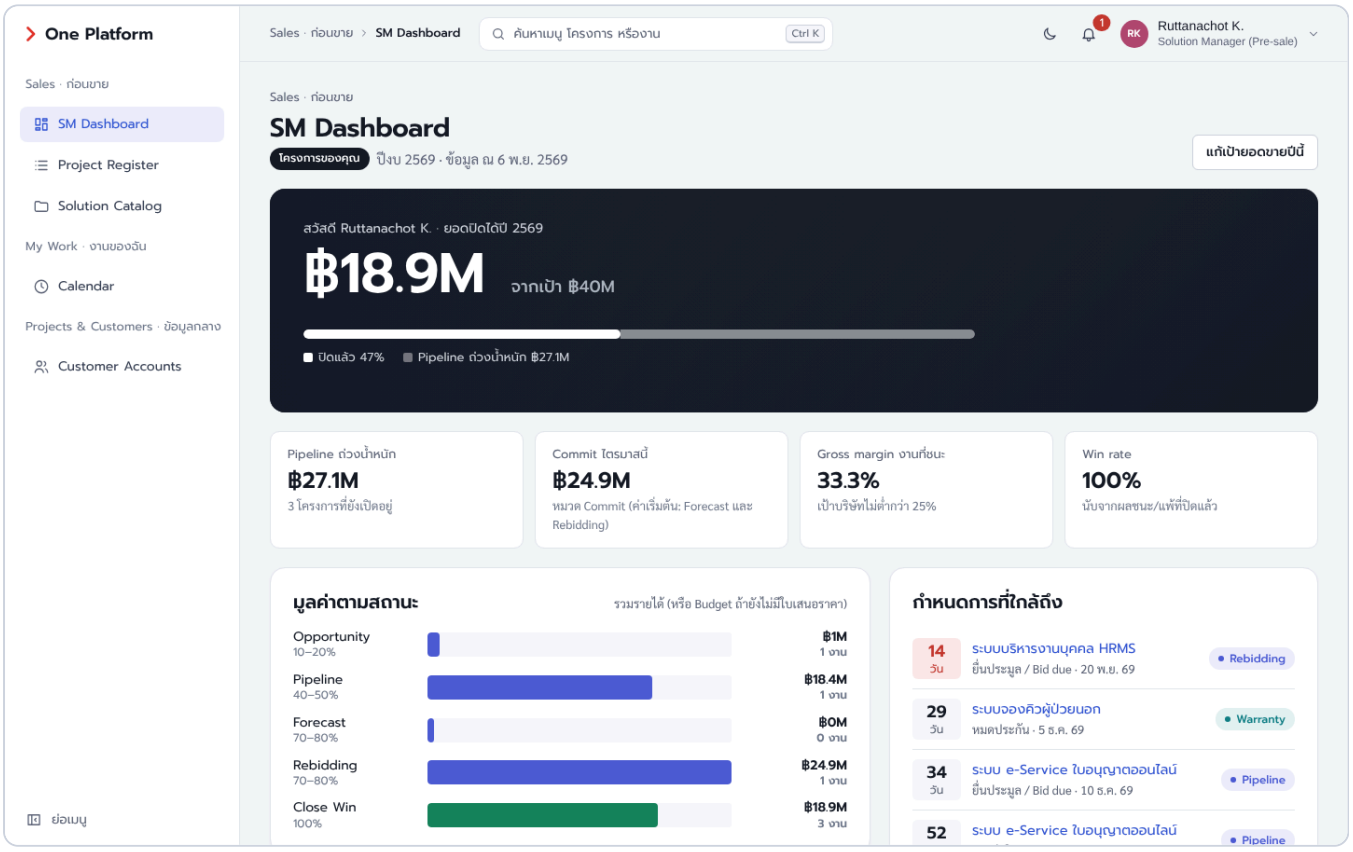

SM Dashboard

เคล็ดลับ กด **ตั้งเป้ายอดขายปีนี้** (มุมขวาบน) เพื่อกำหนดยอดที่ตั้งใจปิดให้ได้ในปี — ระบบเก็บประวัติการแก้เป้า และ SM คนอื่นไม่เห็นเป้าหรือยอดของคุณ

กฎของระบบ ดีลภาครัฐปิด Close Win ได้หลังพ้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และถ้ามูลค่าสัญญาต่างจากราคาที่อนุมัติเกิน ±2% หรือกำไรลดเกิน 3 จุด ต้องขออนุมัติหลังได้งาน

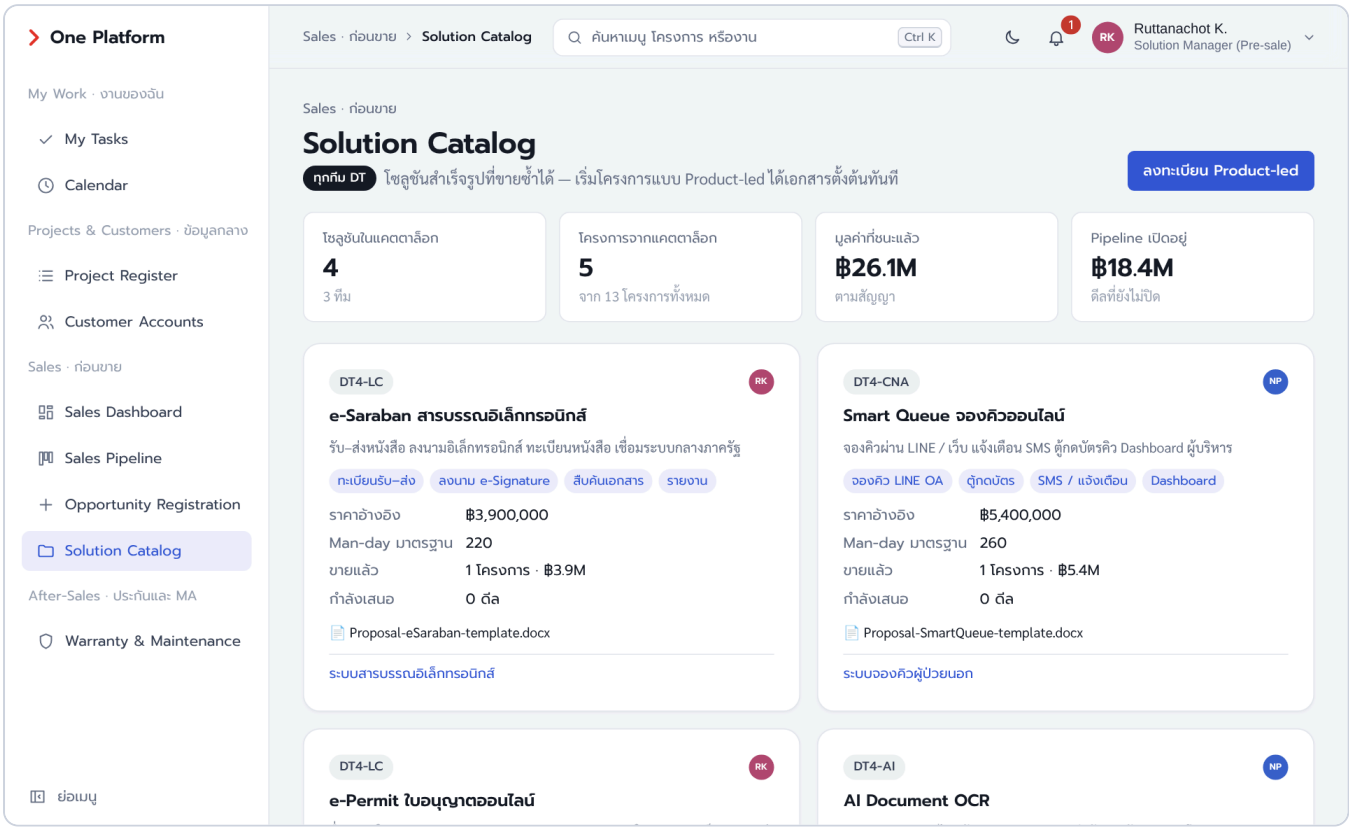


Solution Catalog

6 ผู้บริหาร (Executive)

รองผู้บริหารและผู้บริหาร DT เห็นเมนูสั้น ๆ 5 เมนู: **Executive Dashboard · Project Status Tracker · Mail Inbox · Calendar · Project Register** เมนูที่ต้องลงมือทำงาน เช่น Pipeline จัดซื้อ หรือ Workspace ไม่แสดง แต่เปิดดูโครงการใดก็ได้จาก Dashboard, Tracker หรือ Project Register

Executive Dashboard — ทีมทำได้ตามเป้าไหม

1. ดูแถบ KPI: ยอดชนะเทียบเป้า, Pipeline ถ่วงน้ำหนัก, คำขอรอคุณอนุมัติ, โครงการต้องติดตาม
2. ตาราง **ทีมเทียบเป้า**: จำนวนคน · Workload · โครงการก่อนขาย / ส่งมอบ / MA · ยอดชนะเทียบเป้า · สถานะ
3. เลือกกลุ่ม (DT1–DT4) มุมขวาบนเพื่อกรอง คลิกทีมเพื่อดูโครงการและคนของทีม

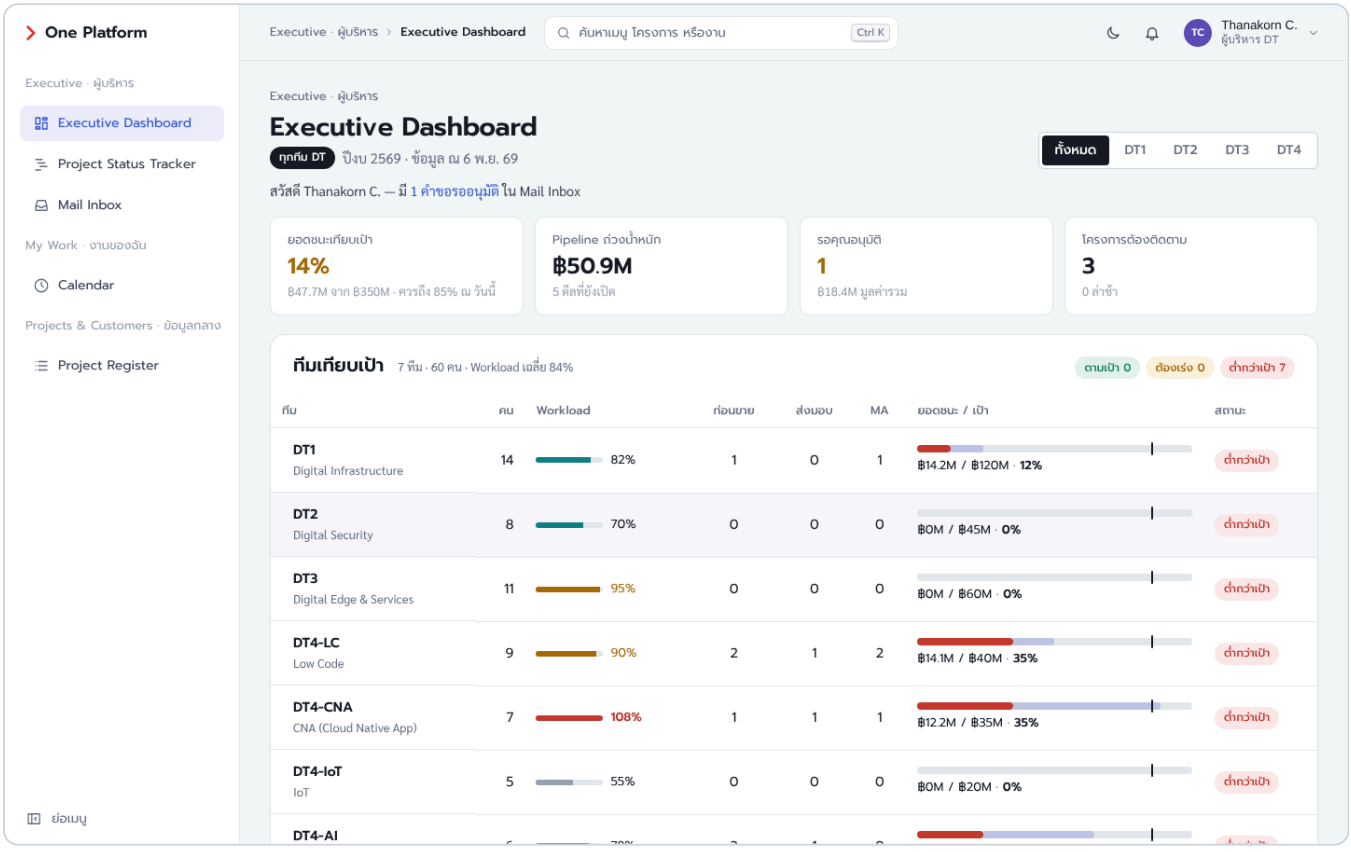


Executive Dashboard

> **กฎของระบบ** สถานะทีม: **ตามเป้า** = ยอดชนะถึง 95% ของเป้าตามสัดส่วนเวลา (เส้นตั้งบนแถบ) · **ต้องเร่ง** = ยังไม่ถึง แต่ยอดชนะ + Pipeline ถ่วงน้ำหนักครอบคลุมเป้าทั้งปี · **ต่ำกว่าเป้า** = ไม่ครอบคลุม

Project Status Tracker — โครงการอยู่ขั้นไหน รอใคร

ระบบคำนวณขั้นจากข้อมูลที่ทีมบันทึกอยู่แล้ว ไม่มีใครต้องกรอกสถานะเพิ่ม

ขั้น	ความหมาย	คำนวณจาก
1 เตรียมข้อเสนอ	SM เก็บ Requirement / ทำราคา / รออนุมัติ	สถานะ Opportunity, Pipeline + คำขออนุมัติ
2 รอ Sale ยื่น	แสดงชื่อ Sale และวันยื่นซอง	Forecast หรือ Rebidding ที่ยังไม่ถึงวันยื่น
3 รอประกาศผล	ยื่นแล้ว รอลูกค้าประกาศ	วันยื่นซองผ่านแล้ว + วันคาดประกาศผล
4 ประกาศผล	ชนะ (รอ SM แจ้งทีม) หรือแพ้	Close Win / Close Lose
5 แจ้งทีม · หา PM	SM แจ้งทีมแล้ว รอ PMO มอบหมาย PM / Handover	การแจ้งทีมพัฒนา + PM ที่ได้รับมอบหมาย
6–8 พัฒนา · ทดสอบ · ส่งมอบ	ความคืบหน้าและงวดงาน	สถานะงานใน Workspace และงวดที่ส่งลูกค้า
9 ประกัน · MA	ทีม MA ดูแล	Warranty / Ended

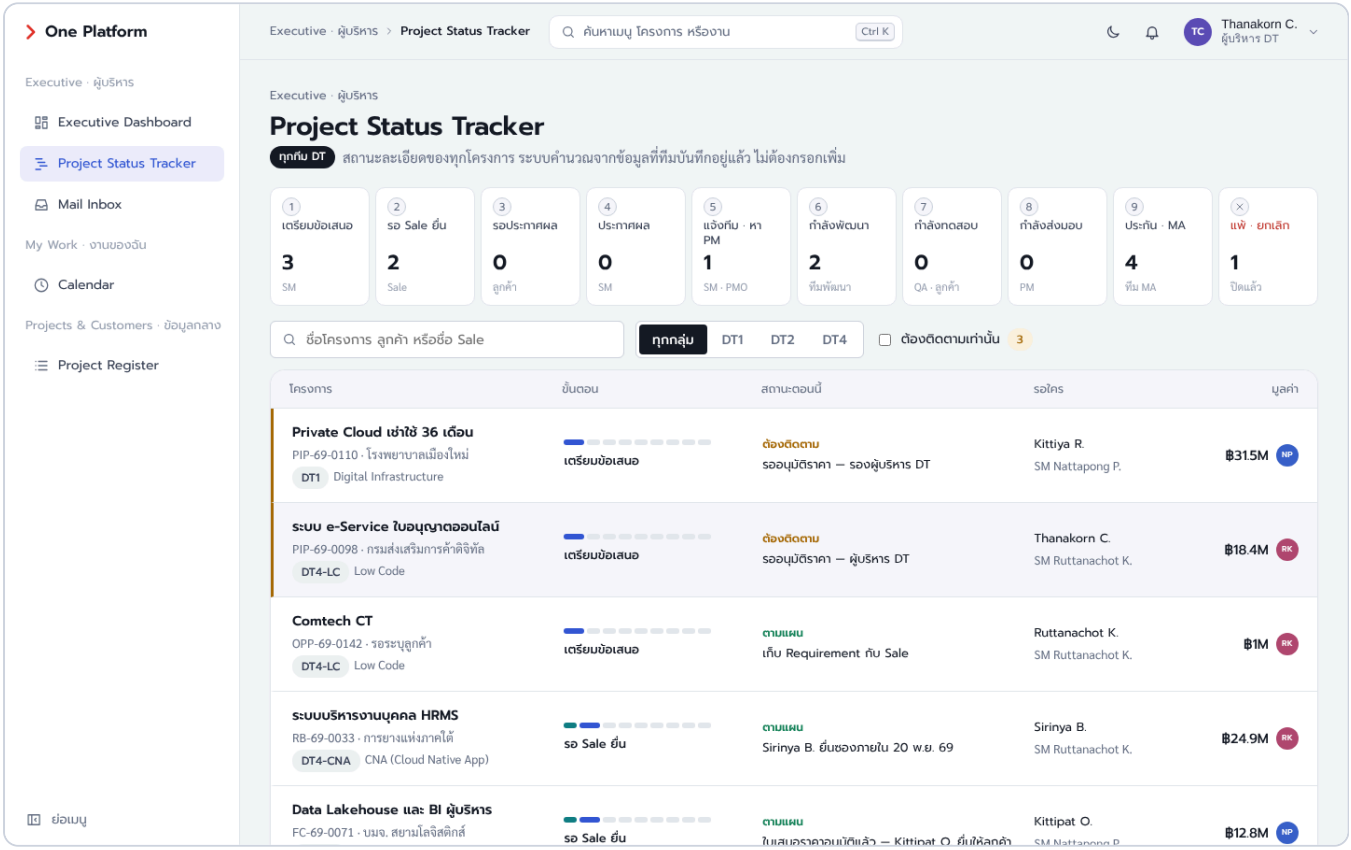


Project Status Tracker

Mail Inbox — อนุมัติราคาในระบบ

1. SM นัดประชุมชี้แจงก่อน แล้วกดส่งขออนุมัติ — ระบบบังคับบันทึกวันที่ ผู้เข้าประชุม และสรุปผล
2. อีเมลเข้า Outlook (บัญชี Microsoft 365) และแสดงในเมนู **Mail Inbox** โฟลเดอร์ Inbox · รอพิจารณา

3. อ่านข้อความ ตัวเลข (ราคา ต้นทุน GP ราคากลาง) บันทึกการประชุม ไฟล์แนบ และลำดับการอนุมัติ
4. กด **Approve** (ใส่ Note ได้) หรือ **Reject** (ต้องระบุสิ่งที่ต้องแก้และเอกสาร) — ระบบตอบกลับ SM และส่งต่อขั้นถัดไปอัตโนมัติ

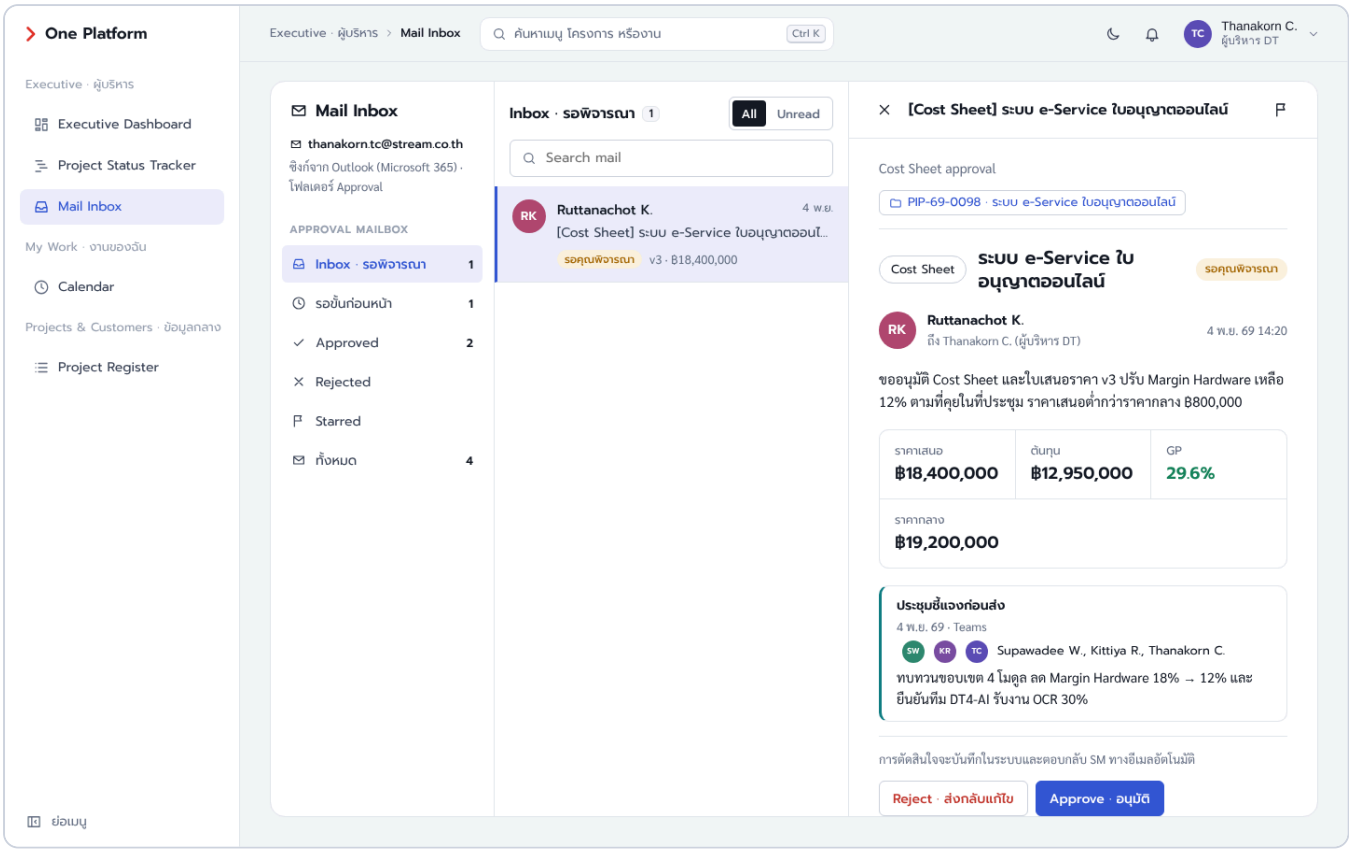


Mail Inbox ของผู้บริหาร

> **เคล็ดลับ** โฟลเดอร์ “รอขั้นก่อนหน้า” แสดงคำขอที่ยังอยู่ที่รองผู้บริหาร ผู้บริหารจะได้อีเมลเมื่อถึงคิว · Approved / Rejected เก็บประวัติการตัดสินใจ

7 หัวหน้ากลุ่ม

ตรวจ TOR Final (หัวหน้ากลุ่ม)

1. เมนู **Approval Requests** ส่วน “TOR Final รอหัวหน้ากลุ่มตรวจ”
2. เปิดโครงการ แท็บ Requirement และ TOR แล้วกด **ผ่าน** หรือ **ส่งกลับแก้** พร้อมความเห็น

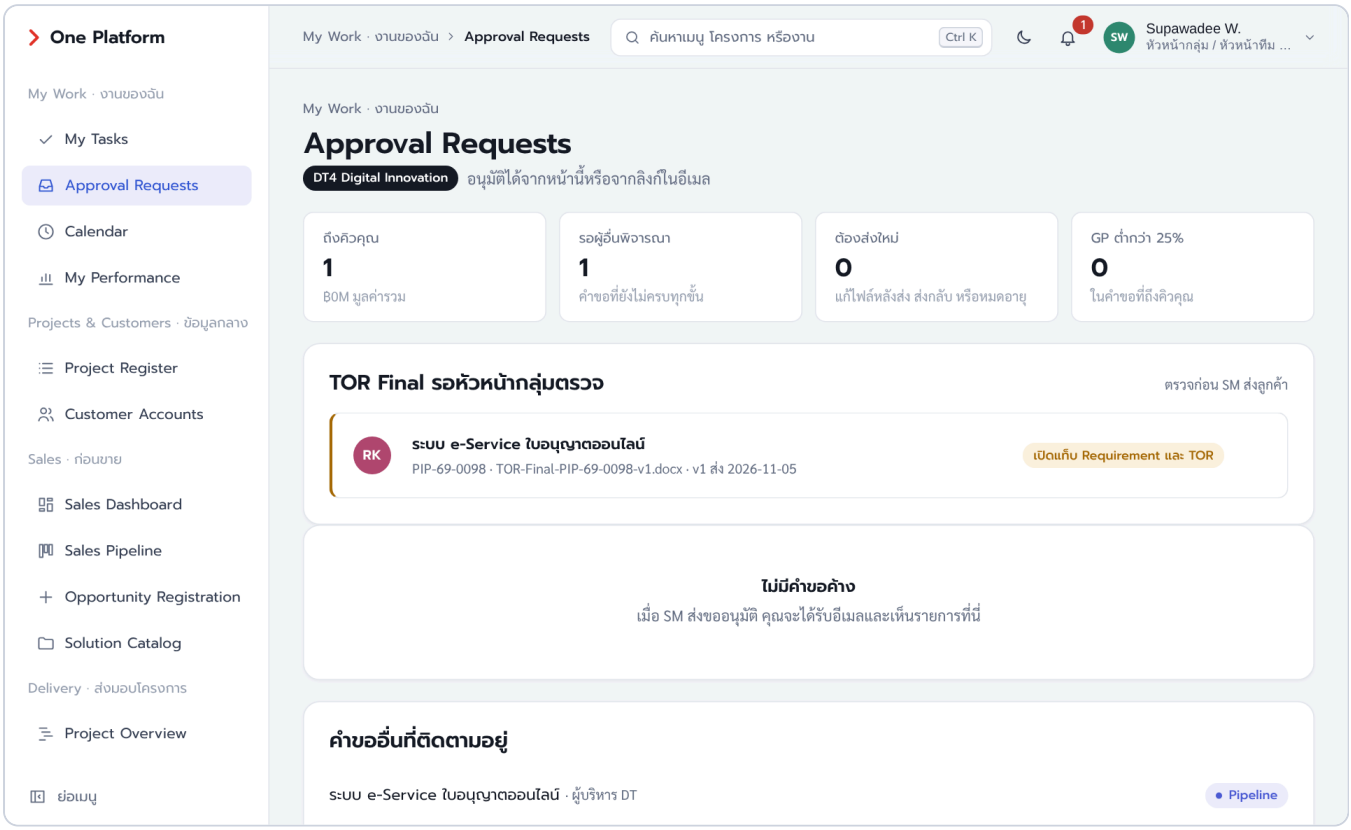


คิว TOR Final ของหัวหน้ากลุ่ม

จัดคนให้โครงการ (หัวหน้าทีม Dev)

1. เมนู **Resource Workload** ส่วน “คำขอคนจาก PM”
2. กด **จัดคน** เลือกคนจากรายการ (เรียงจากงานค้างน้อย คนที่ลาช่วงนั้นอยู่ท้าย) ระบบเพิ่มเป็นสมาชิกพื้นที่งานให้

> **เคล็ดลับ** PMO ปรับความถนัดของ PM แต่ละคนได้ที่เมนู **Resource Workload** ส่วน “PM และความถนัด”

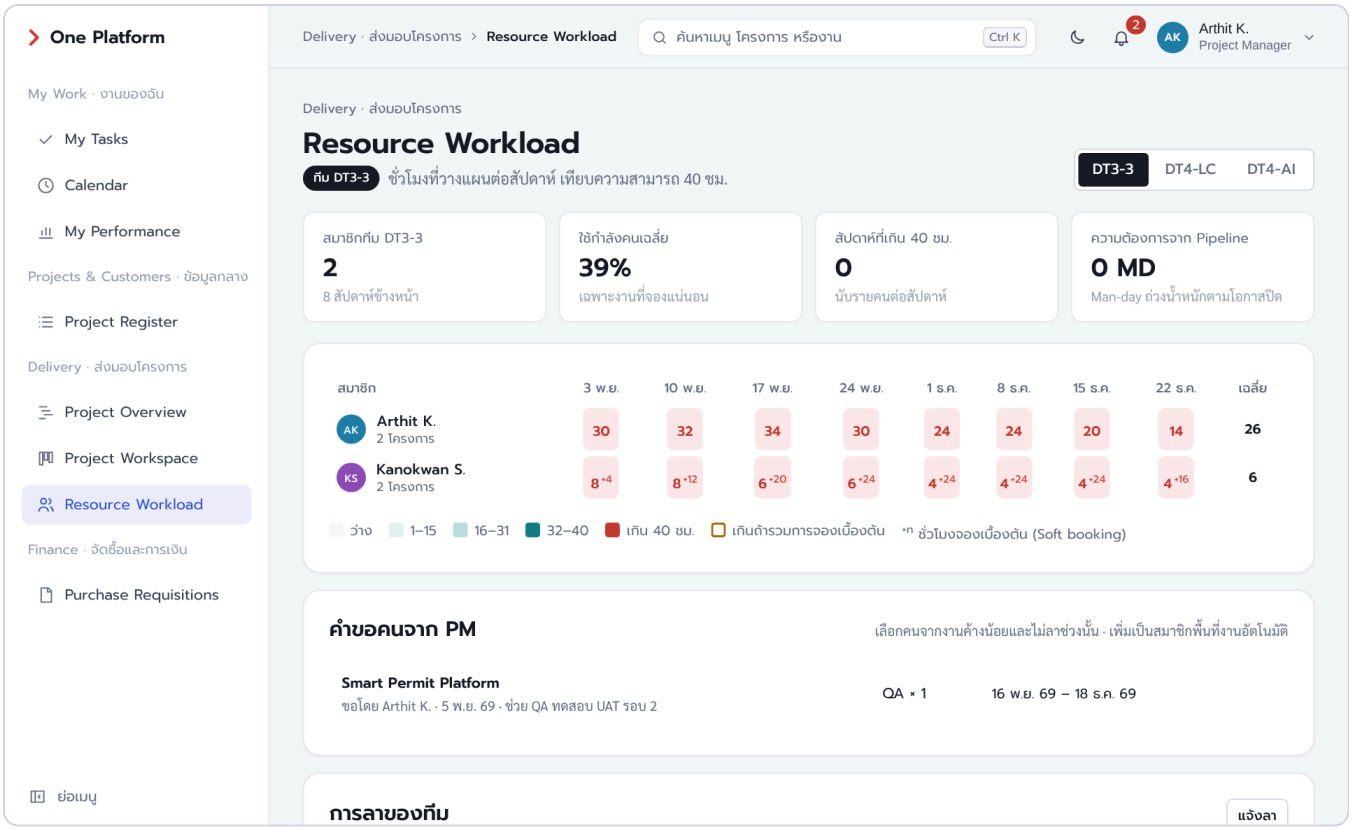


Resource Workload: ภาระงาน คำขอคน และปฏิทินการลาของทีม

8 PMO และ Project Manager

1. Handover

1. PMO เปิดโครงการที่ชนะแล้ว แท็บ **Handover** ระบบเรียงรายชื่อ PM ตามความถนัดที่ตรงกับโครงการ (เช่น ติดตั้ง Hardware ลงพื้นที่บ่อย หรือพัฒนาระบบ Software) และจำนวนโครงการที่ดูแลอยู่ — เลือก PM แล้วกด **มอบหมาย PM และนัดประชุม Handover** — PM ได้สิทธิ์ Manage Project และระบบส่งนัด Teams ถึง 5 ฝ่าย (SM · PM · MA · OPN · หัวหน้าทีม Dev)
2. หลังประชุม ติ๊กผู้เข้าร่วม กรอกเงื่อนไขสัญญา (ค่าปรับ ระยะประกัน SLA) และหลักประกันสัญญา
3. กด **เริ่มส่งมอบ** — ระบบตรวจ Handover gate และเปิดให้สร้างพื้นที่งาน

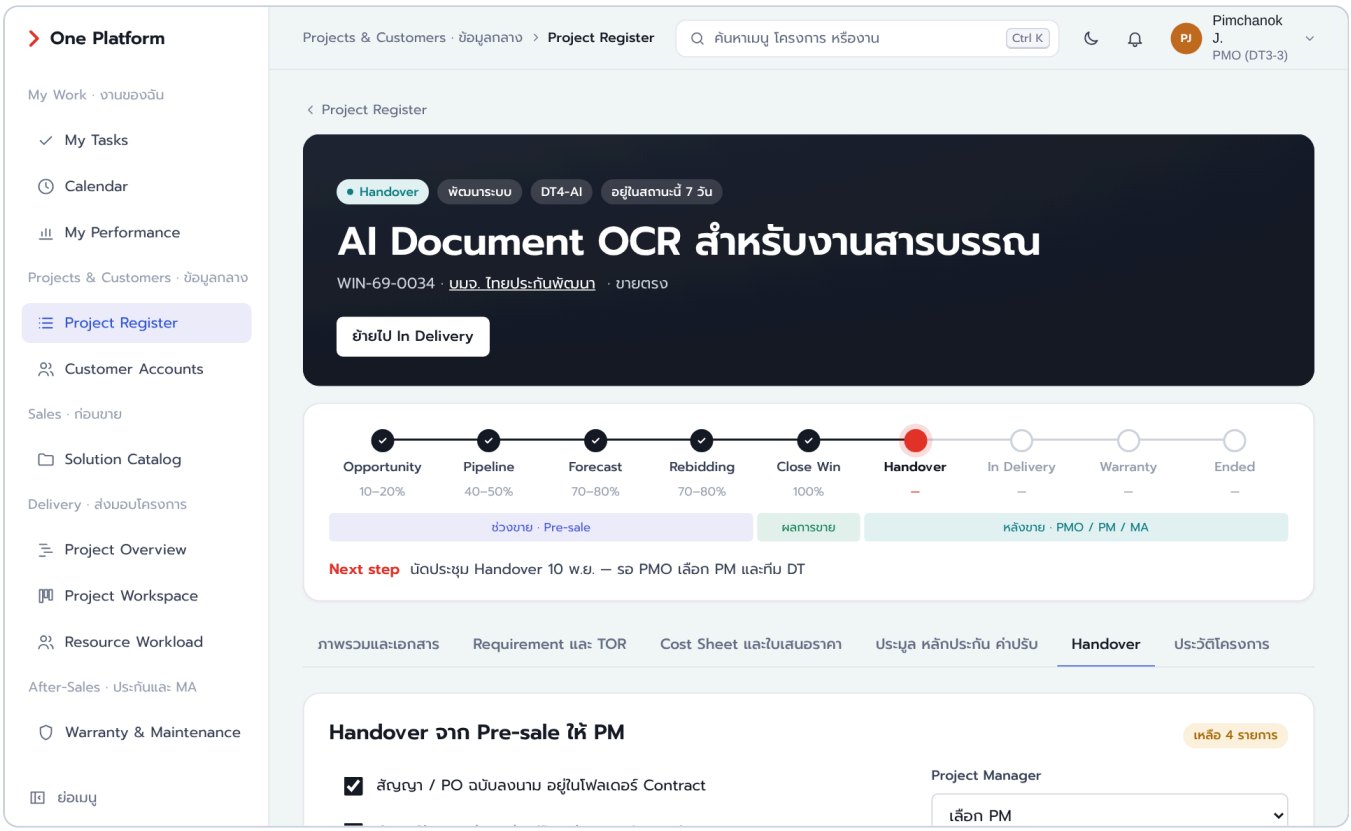


Handover จาก Pre-sale ให้ PM

2. Project Workspace


เมนู **Project Workspace** → เลือกโครงการ ครั้งแรกเลือกรูปแบบ **ตามงวดงาน (Waterfall) / Scrum / Kanban** แท็บในพื้นที่งาน:

แท็บ	ใช้ทำอะไร
Summary	ภาพรวมสถานะ กิจกรรมล่าสุด งานใกล้ครบกำหนด ภาระงานรายคน
List / Board / Calendar / Timeline	จัดการงานแบบตาราง บอร์ด ปฏิทิน และไทม์ไลน์ (ลากเพื่อย้าย/เลื่อนวัน)

แท็บ	ใช้ทำอะไร
Backlog (Scrum)	วางแผน Sprint เริ่ม/ปิด Sprint
Milestones	งวดงาน: สิ่งส่งมอบ → Final Check → ส่งลูกค้า → ตรวจรับ → ส่งมอบเข้าประกัน
Risks	ทะเบียนความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)
Stakeholders	ผู้ติดต่อทั้ง 2 ฝ่าย (Focal Point) และนัดประชุม
Reports	Burndown, Velocity, งวดงาน, เวลาและ OT ของทีม
Docs / Forms	หน้าเอกสาร บันทึกประชุม และแบบฟอร์มให้ลูกค้าแจ้ง UAT / CR
Settings	สมาชิกและบทบาท Workflow Automation และคำขอคน

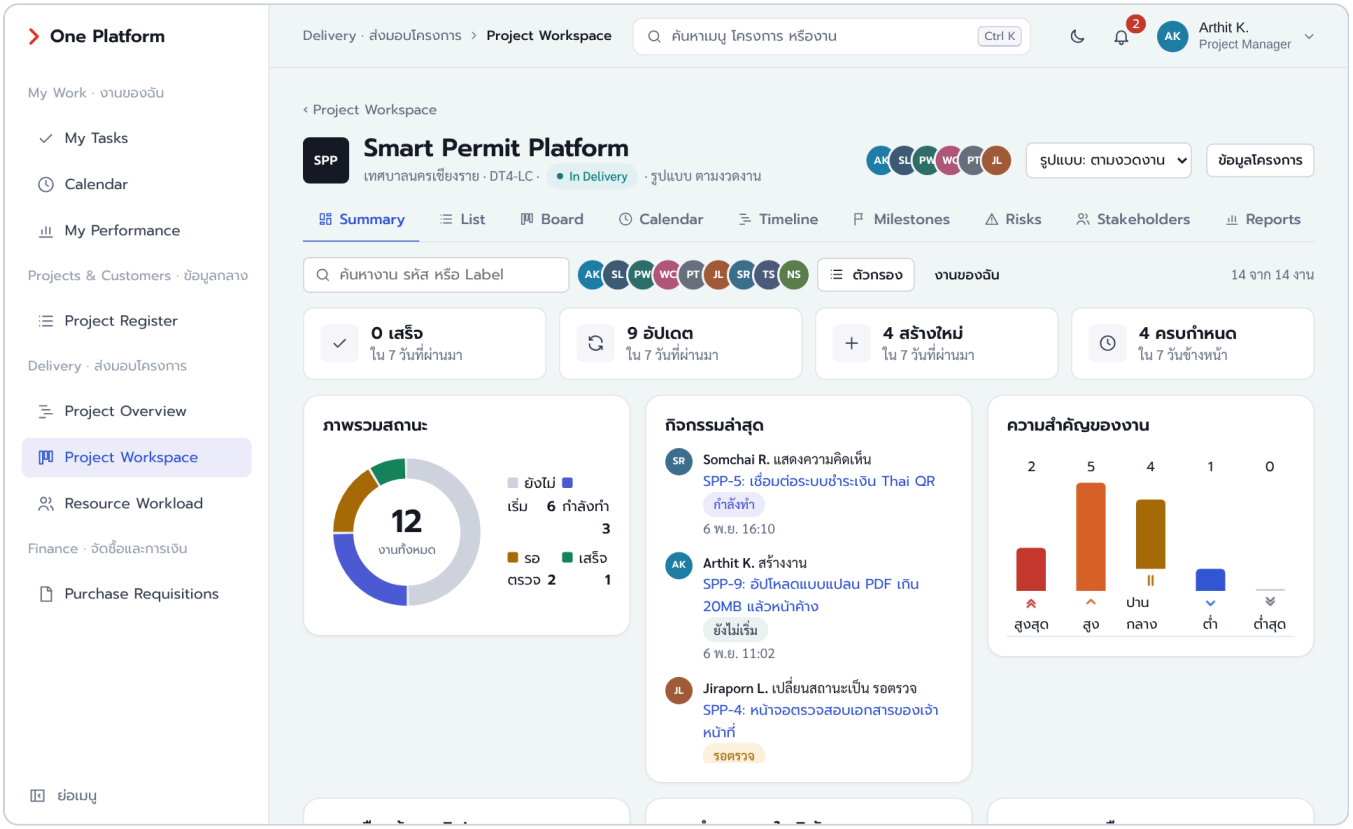

Summary ของพื้นที่งาน

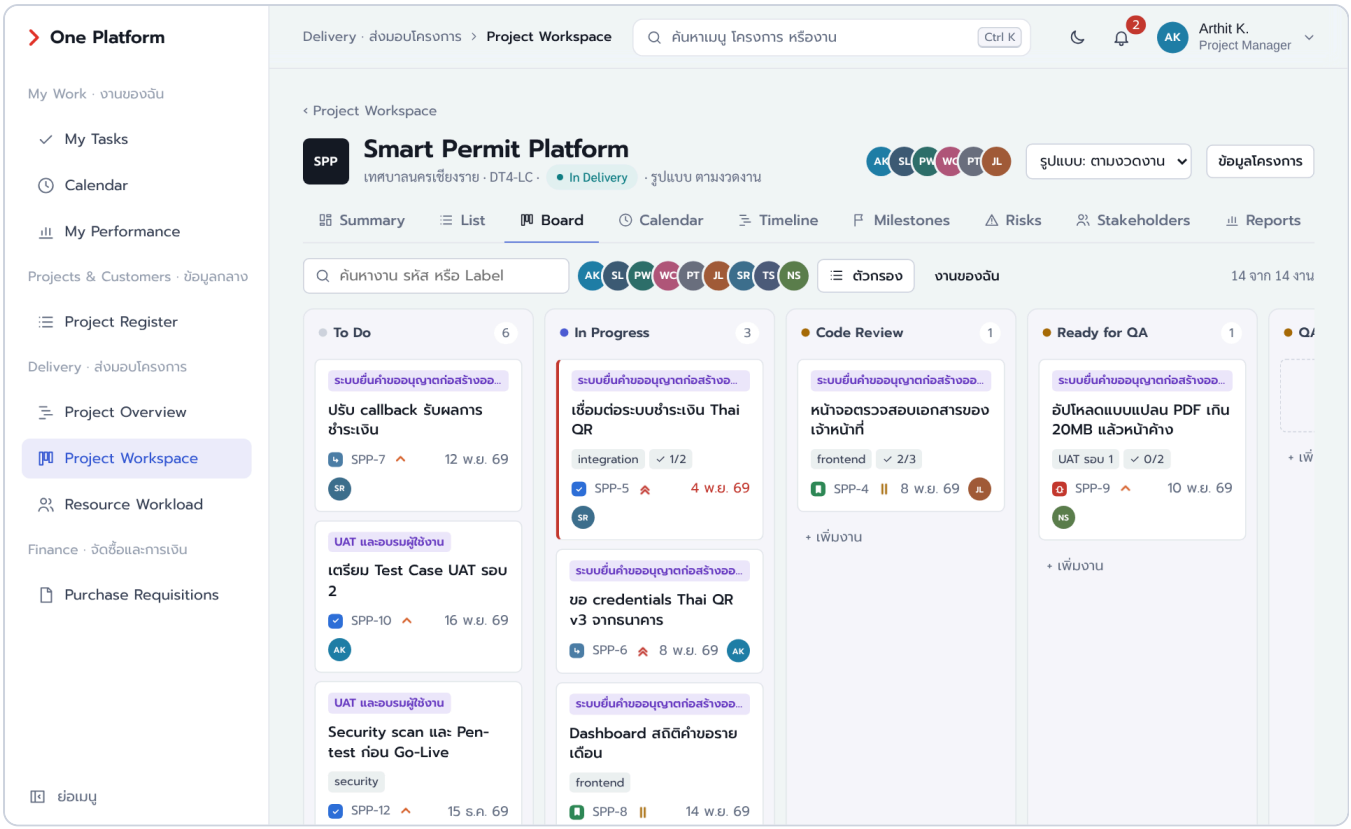


Board: ลากการ์ดเพื่อย้ายสถานะ (ระบบตรวจกฎ Workflow)

> **กฎของระบบ** Workflow มาตรฐาน: To Do → In Progress → Code Review → Ready for QA → QA → UAT → Done ย้ายไปข้างหน้าทีละขั้น ย้อนกลับได้ทุกขั้น เข้า Done ได้เฉพาะ QA / PM / หัวหน้าทีม และต้องติ๊ก Acceptance criteria ครบ

3. ทีมโครงการ


1. แท็บ **Settings** → สมาชิกและสิทธิ์ — เพิ่มคนและกำหนดบทบาท (SA, BA, UX/UI, Front-end, Back-end, DevOps, QA ฯลฯ)
2. ถ้าต้องการคนเพิ่ม กด **+ ขอคน** ระบุบทบาท จำนวน ช่วงเวลา — หัวหน้าทีมได้รับคำขอ

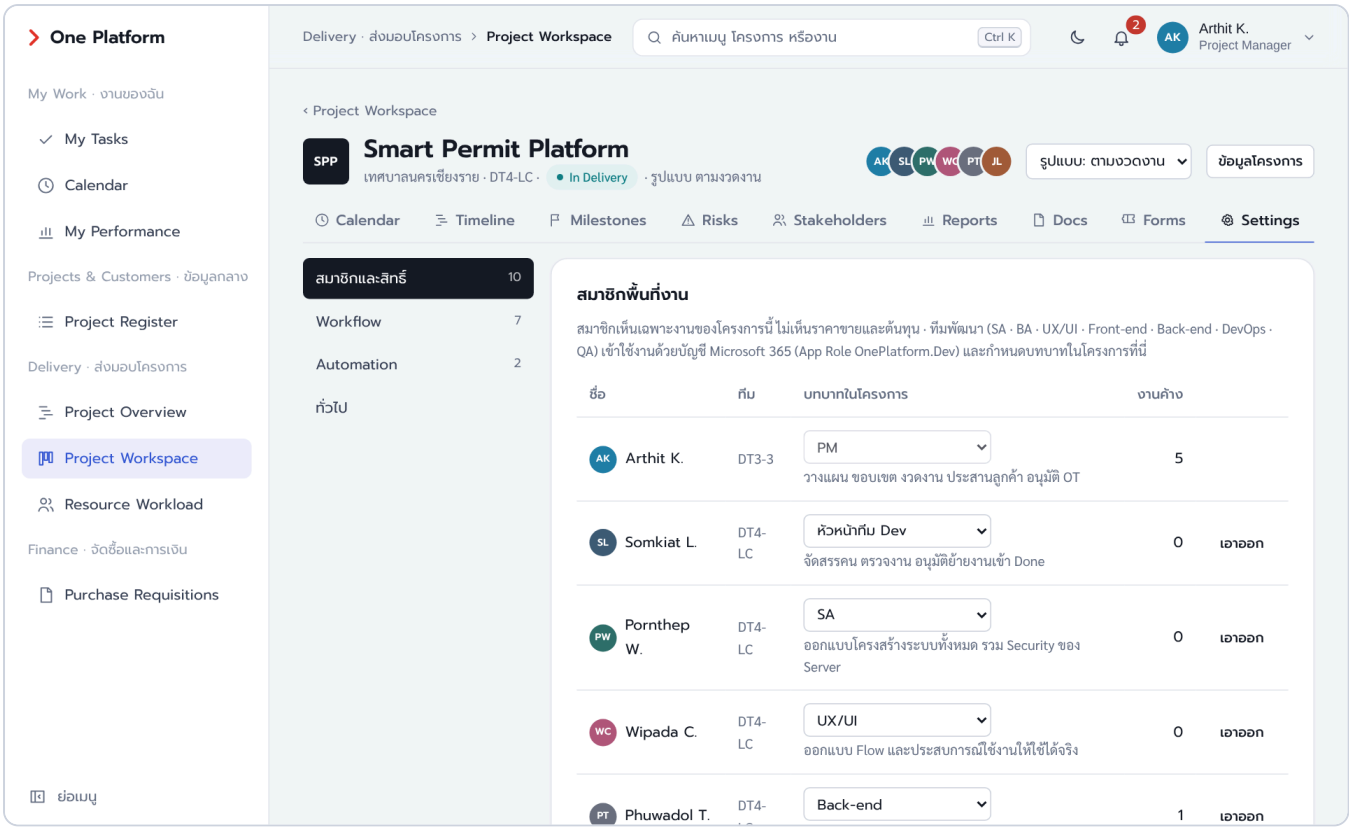

สมาชิก บทบาท และคำขอคน

4. ผู้ติดต่อและประชุม


1. แท็บ **Stakeholders** เพิ่มผู้ติดต่อฝั่งลูกค้าและฝั่งเรา ระบุ Focal Point
2. กดปุ่มประเภทประชุม (Kick-off, ประชุมทีม, เก็บ Requirement, ทบทวนงวดงาน) เลือกผู้เข้าร่วม — ระบบส่งนัด Outlook + Teams และสร้างหน้าบันทึกประชุม

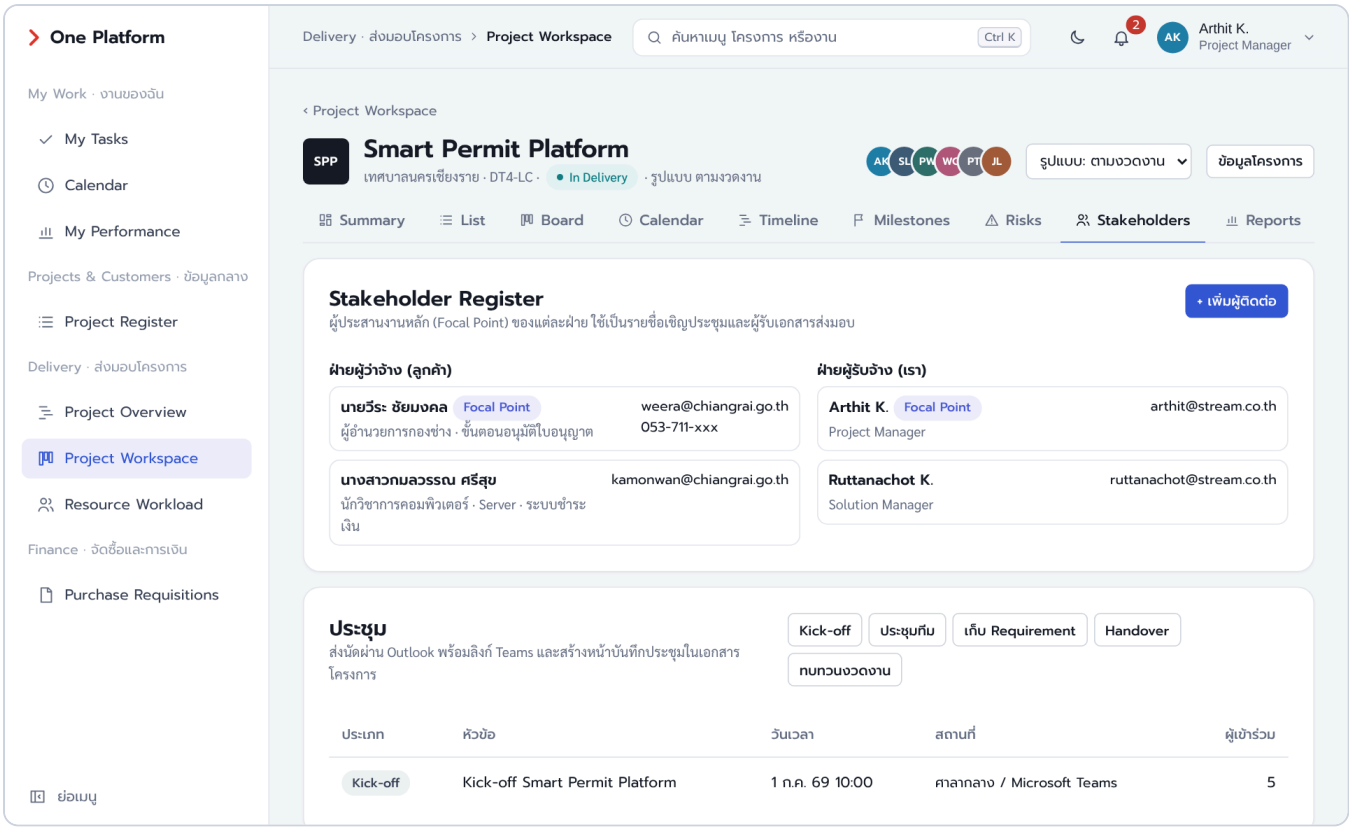

Stakeholder Register และประชุม

5. งวดงานและการส่งมอบ


1. แท็บ **Milestones** เพิ่มสิ่งส่งมอบของแต่ละงวด และเปลี่ยนสถานะ ร่าง → กำลังตรวจ → พร้อมส่ง
2. เมื่อทุกชิ้นพร้อม กด **Final Check** แล้ว **ส่งลูกค้า**
3. ลูกค้าตรวจรับแล้ว กด **บันทึกตรวจรับ** แนบหนังสือตรวจรับ — ระบบแจ้ง OPN วางบิล
4. ตรวจรับครบทุกงวด กด **ส่งมอบเข้าประกัน** ระบุผู้ติดต่อ — ทีม MA ได้รับงาน

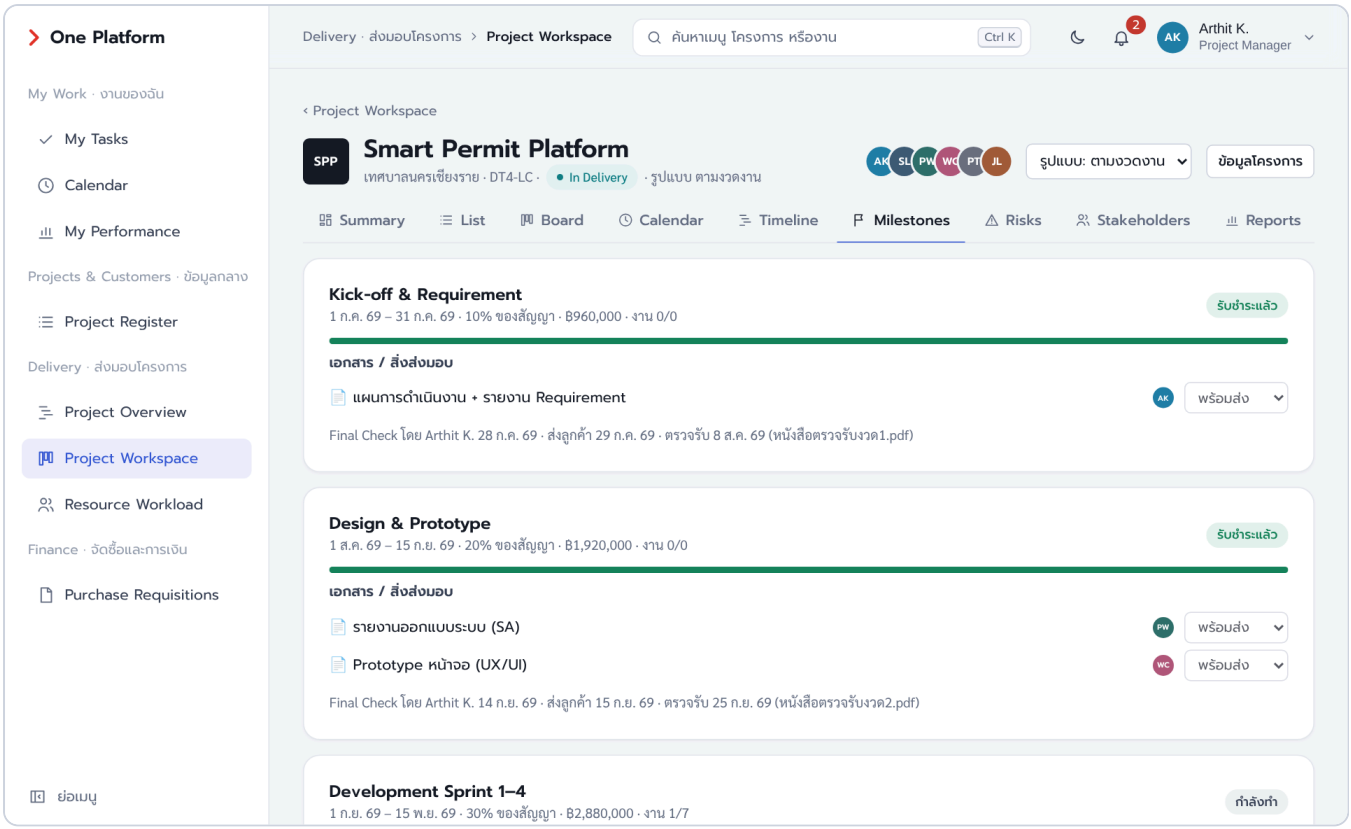


Milestones: สิ่งส่งมอบ Final Check และตรวจรับ

6. ความเสี่ยง OT และการจัดซื้อ

1. แท็บ **Risks** บันทึกความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ เจ้าของ แผนรับมือ (ความเสี่ยงสูงแจ้งหัวหน้ากลุ่มอัตโนมัติ)
2. อนุมัติ OT: หน้าโครงการ แท็บแผนงาน → OT (ภายในเงินกันของ Cost Sheet; เกินเงินกันต้องหัวหน้าทีม → รองผู้บริหาร)
3. ขอซื้อ: เมนู **Purchase Requisitions** เลือกรายการจาก Cost Sheet — OPN อนุมัติเบิกจ่าย
4. เมื่อมีคนลา: เมนู Resource Workload → บันทึกการลา กด **อนุมัติเลื่อน** หรือ **ส่งต่องาน**

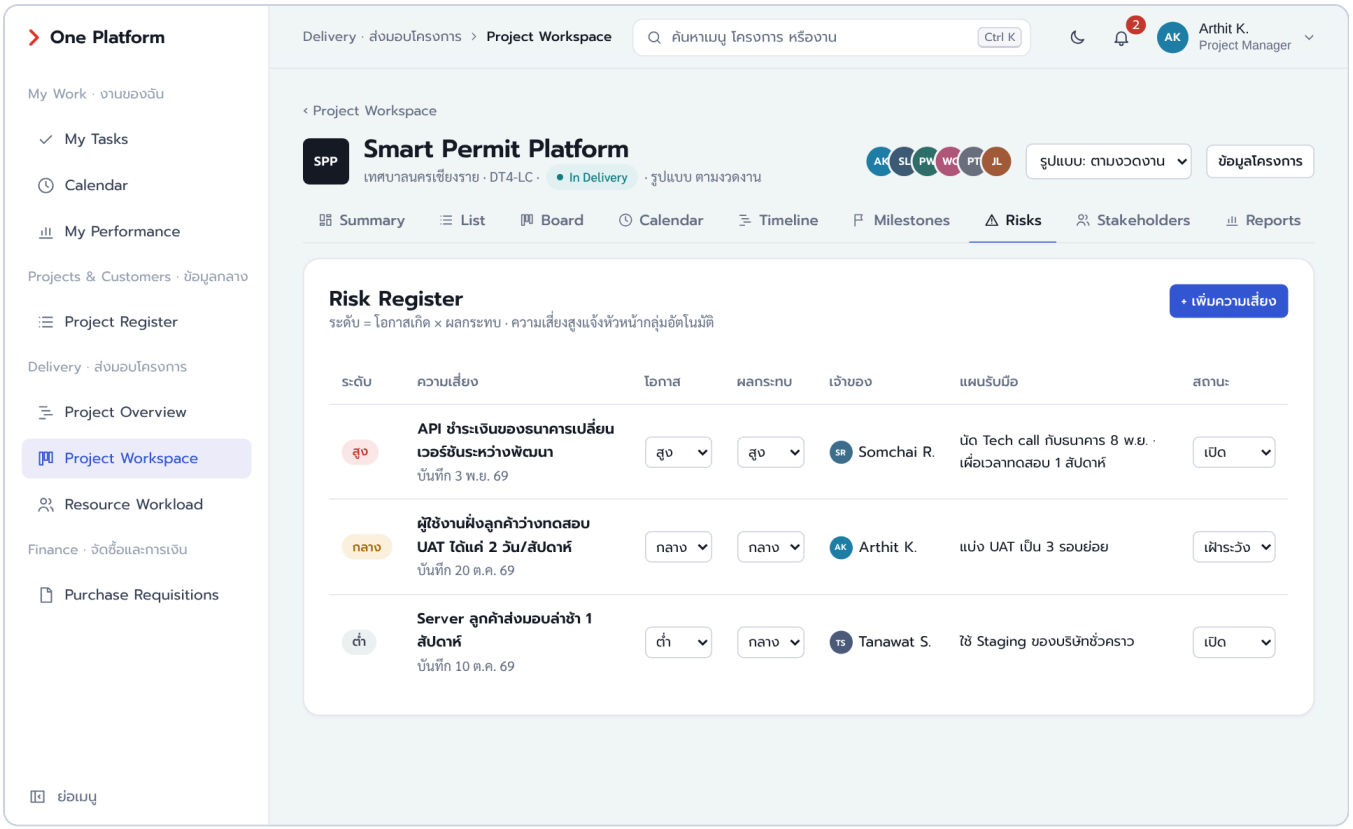


Risk Register

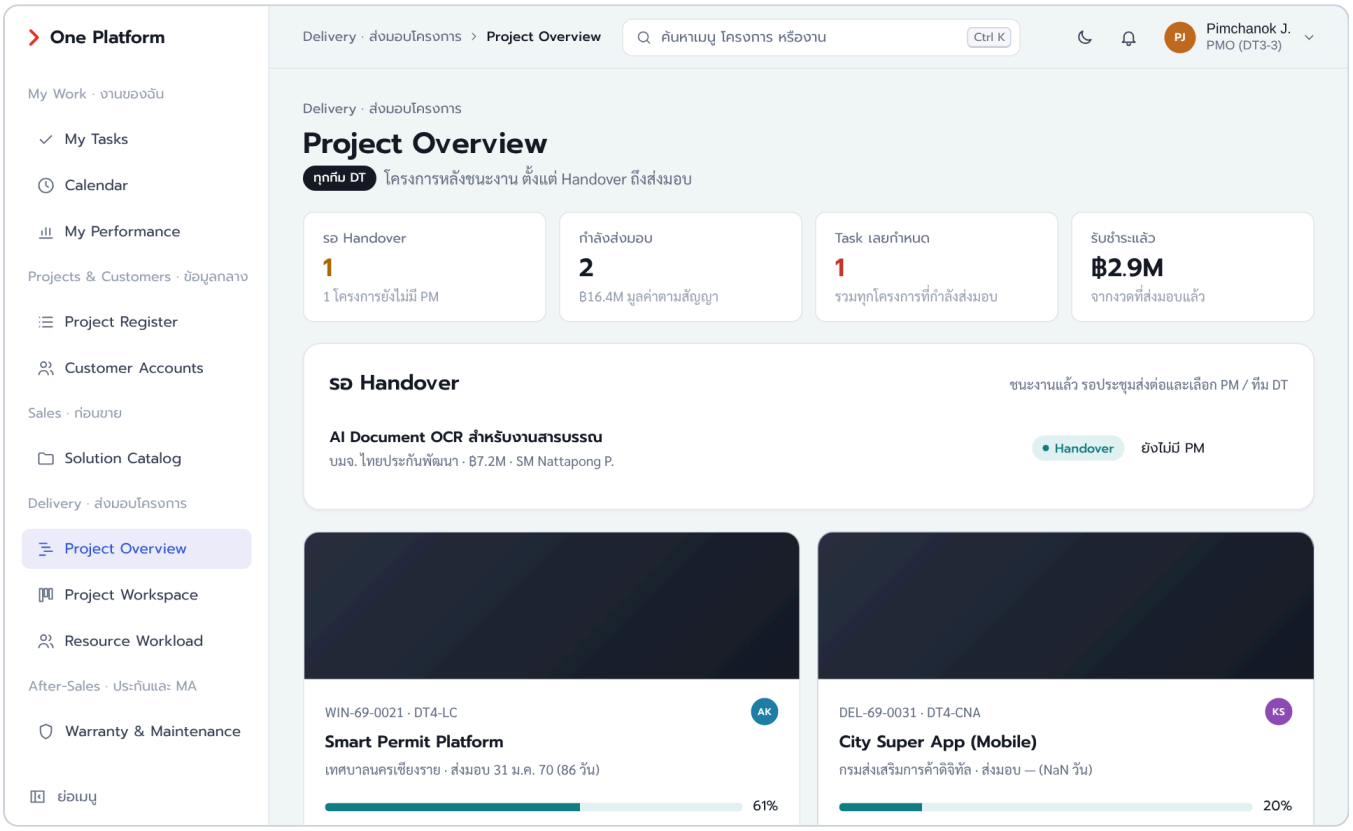

Project Overview สำหรับผู้บริหารและ PMO

9 ทีมพัฒนา (SA · BA · UX/UI · Dev · DevOps · QA)


1. เปิด **My Tasks** ทุกเช้า เลือกงาน แล้วเปลี่ยนสถานะเป็น In Progress
2. คลิกชื่องานเพื่อเปิดรายละเอียด: กรอกรายละเอียด แนบไฟล์ ติ๊ก Acceptance criteria เพิ่ม Sub-task
3. ทำเสร็จ ย้ายต่อ Code Review → Ready for QA (ระบบมอบหมาย QA ให้อัตโนมัติ) → QA ทดสอบแล้วย้าย Done

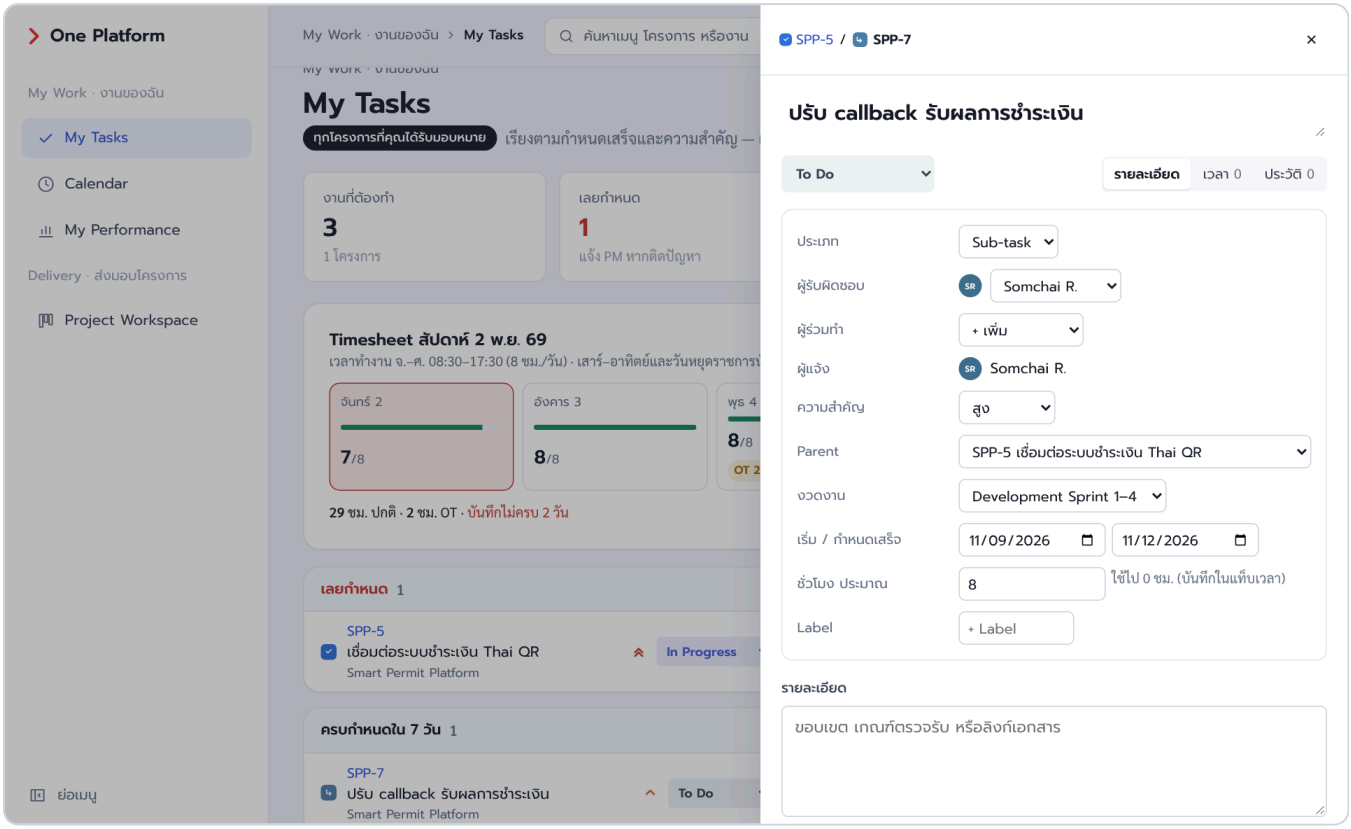

รายละเอียดงาน: สถานะ ผู้รับผิดชอบ Acceptance criteria ไฟล์แนบ

บันทึกเวลาและ OT

1. ในรายละเอียดงาน แท็บ **เวลา** ใส่วันที่ เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด
2. ระบบแยก **เวลาปกติ** (จ.–ศ. 08:30–17:30 ไม่นับพัก 12:00–13:00) กับ **OT** (นอกเวลา เสาร์–อาทิตย์ วันหยุดราชการ) ให้อัตโนมัติ
3. ถ้ามี OT ต้องระบุว่าทำอะไรและ **แนบหลักฐาน** แล้วกดบันทึก — ระบบสร้างคำขอ OT ให้ PM อนุมัติ
4. ดูยอดรายสัปดาห์ที่ Timesheet ในหน้า My Tasks (วันที่บันทึกไม่ครบ 8 ชม. เป็นสีแดง)

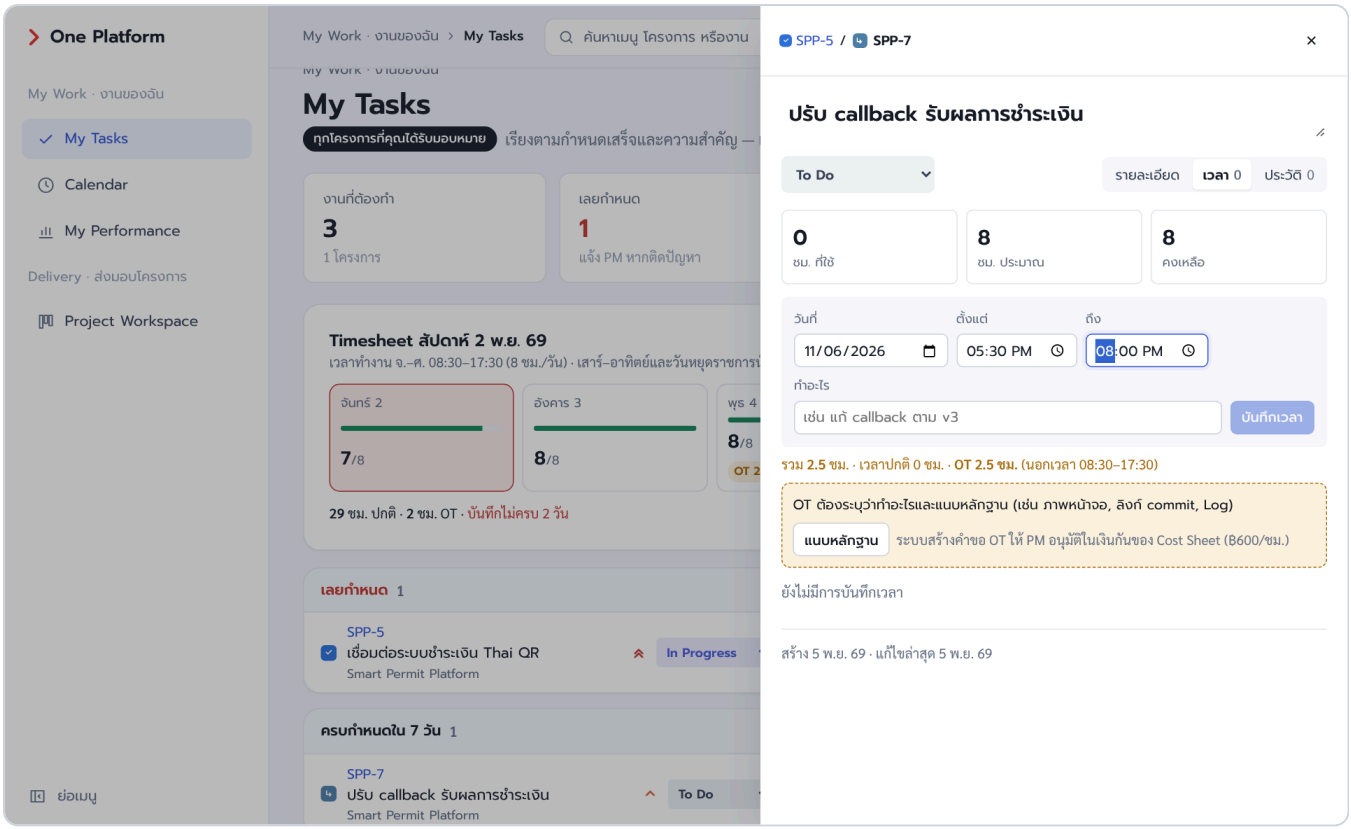

บันทึกเวลา ระบบแยก OT และขอหลักฐาน


รายงาน Preventive Maintenance

เมื่อถึงรอบ งานขึ้นใน My Tasks ส่วน “รายงาน Preventive Maintenance ที่ต้องเตรียม” กด **เตรียมรายงาน** กรอกสรุปผลตรวจ สิ่งที่พบ ข้อแนะนำ แนบไฟล์จาก Template แล้วกด **ส่งให้ทีม MA**

10 ทีม MA และ Call center

รับมอบเข้าประกัน


1. เมนู **Warranty & Maintenance** ส่วน “รอรับมอบเข้าประกัน”
2. ตรวจเอกสารและผู้ติดต่อ แล้วกด **รับมอบเข้าประกัน** — ระบบคำนวณวันเริ่ม/หมดประกันจากสัญญา และสร้างรอบรายงาน PM

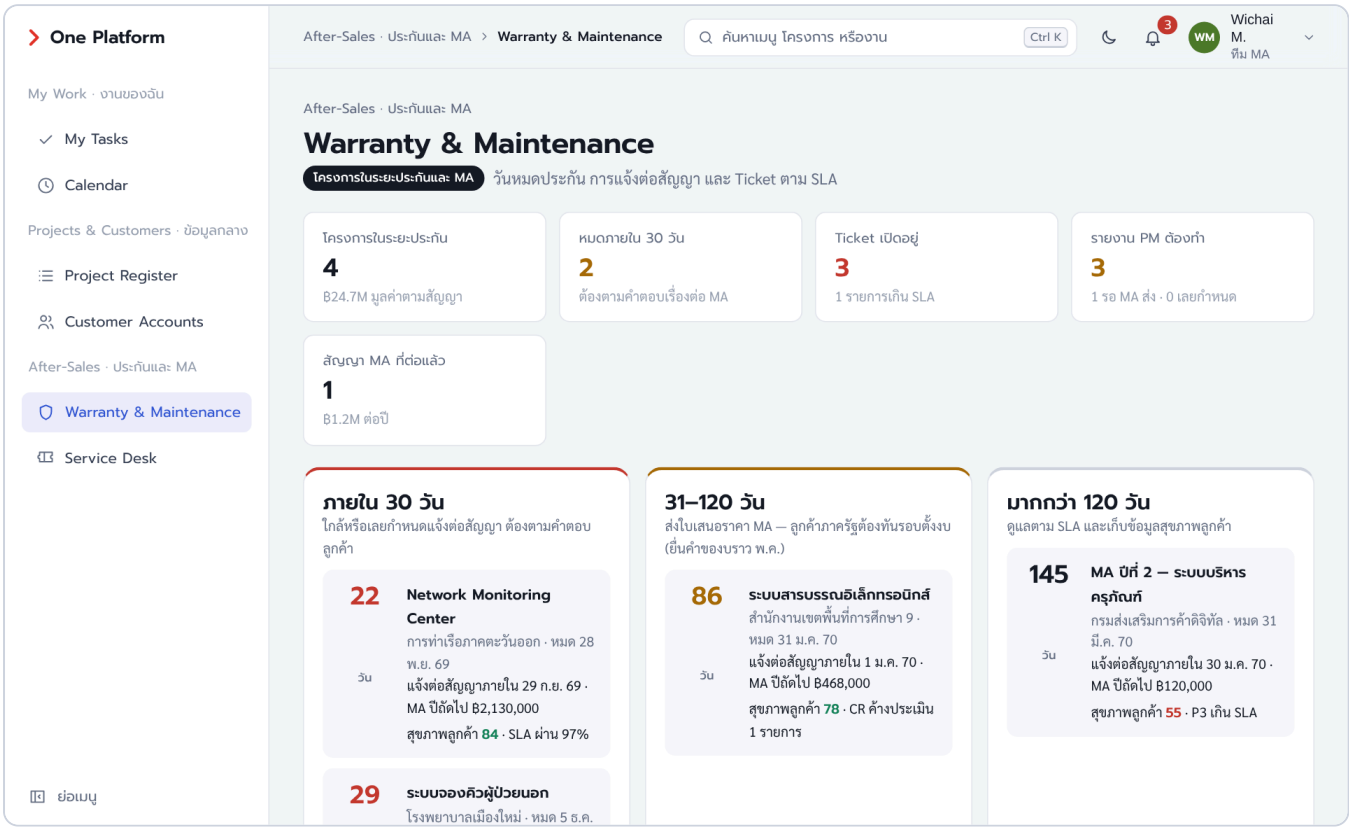

Warranty & Maintenance: วันหมดประกัน รอบ PM และคิวงาน

รอบ Preventive Maintenance

1. รอบ (รายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน) และวันรอบแรกกำหนดตอนเสนอขาย ทีม MA แก้ได้ที่ปุ่ม **แก้รอบ PM**
2. ทีมพัฒนาเตรียมรายงานและส่งให้ทีม MA → สถานะ “รอ MA ส่งอีเมล”
3. กด **ส่งอีเมลถึงลูกค้า** ตรวจข้อความ (ส่งจากกล่องกลาง ma-support@) แล้วส่ง หรือ **ส่งกลับให้แก้**

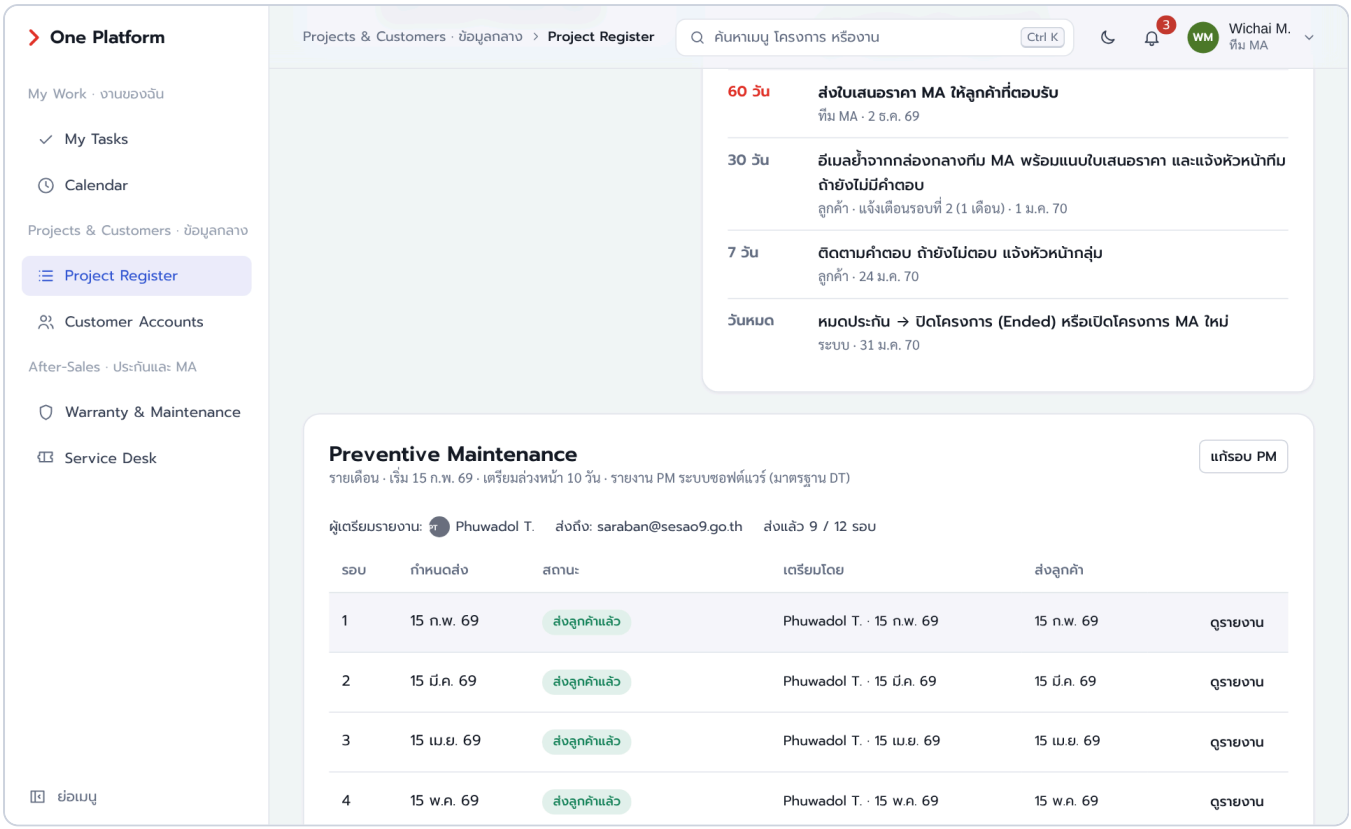


ตารางรอบ Preventive Maintenance ของโครงการ

ต่อสัญญา MA

1. ระบบส่งอีเมลถึงลูกค้าอัตโนมัติ **รอบที่ 1 เมื่อเหลือ 90 วัน** และ **รอบที่ 2 เมื่อเหลือ 30 วัน** (แจ้งหัวหน้าด้วย)
2. ลูกค้าสนใจ: หน้าโครงการ แท็บประกันและ MA กด **ลูกค้าต่อ MA — เปิดโครงการใหม่** ทำใบเสนอราคาและขออนุมัติตามขั้นตอนปกติ

Service Desk (Call center)


เมนู **Service Desk** เปิด Ticket ระบุระบบ ความรุนแรง และช่องทาง ระบบนับ SLA (หยุดนับเมื่อรอลูกค้า) และเตือนเมื่อใช้เวลาเกิน 80%

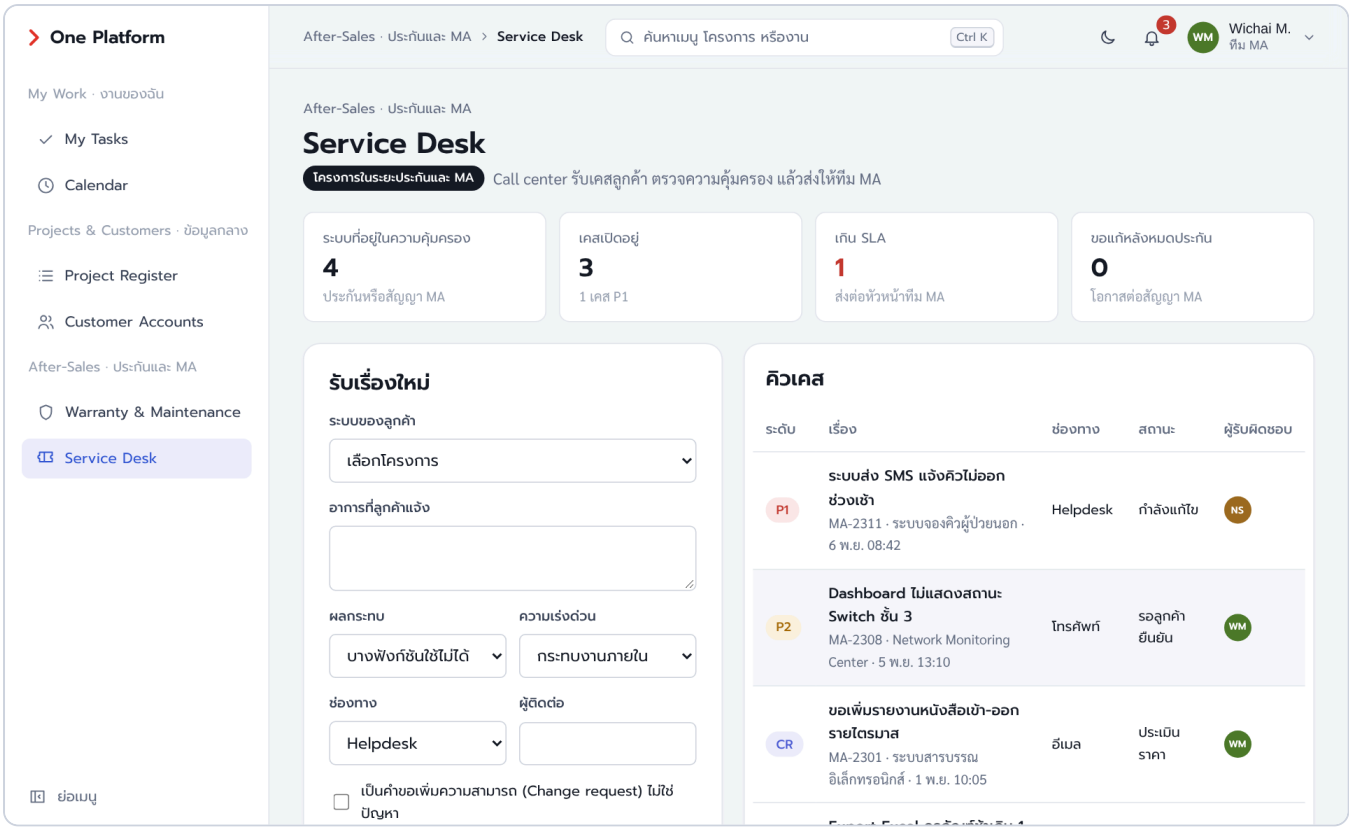


Service Desk และ SLA

11 OPN (จัดซื้อและการเงิน)

1. เมนู **Purchase Requisitions** ตรวจคำขอซื้อจาก PM เทียบงบคงเหลือของรายการใน Cost Sheet แล้วอนุมัติเบิกจ่าย
2. เมื่อ PM บันทึกตรวจรับงวด ระบบแจ้งให้วางบิลงวดนั้น
3. เมนู **Bank Guarantees** ติดตามหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา วันคืนหลักประกัน

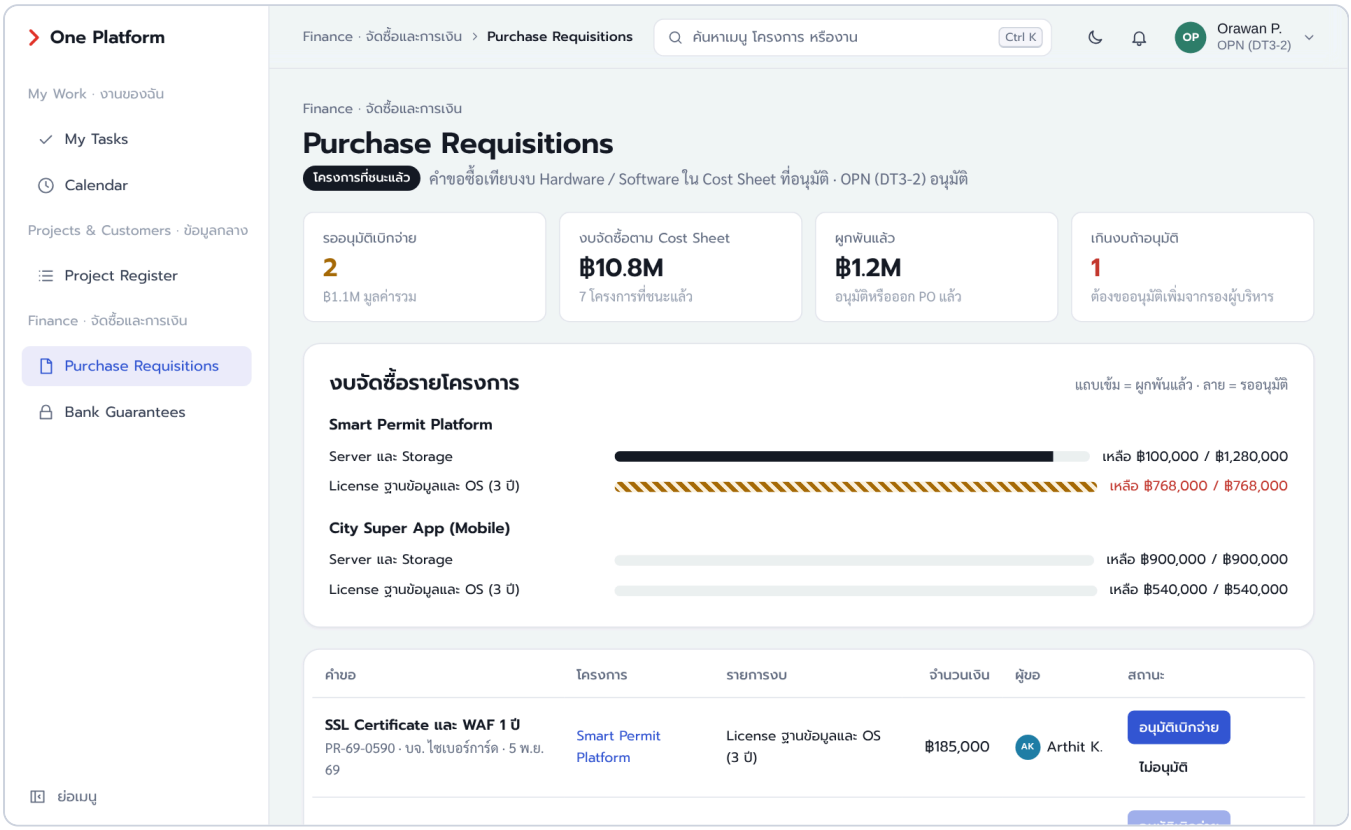

Purchase Requisitions

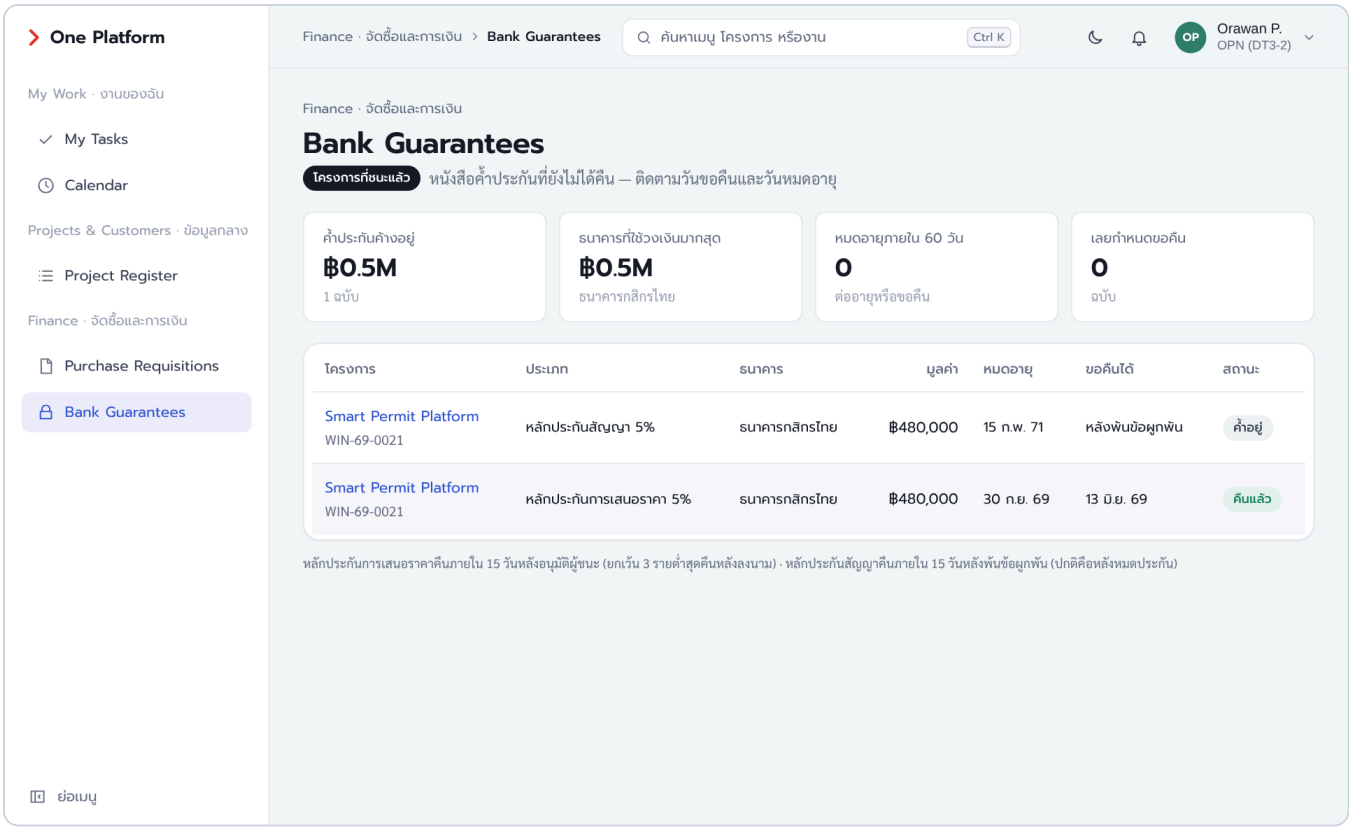


Bank Guarantees

12 ผู้ดูแลระบบ


แท็บใน System Settings	ใช้ทำอะไร
สิทธิ์ตามบทบาท	ตารางสิทธิ์ของแต่ละบทบาท
ลำดับการอนุมัติ	ผู้อนุมัติ เกณฑ์ ±% มูลค่าสัญญา อายุใบเสนอราคา
ปฏิทินวันทำการ	วันหยุดราชการ เวลาทำงาน พักกลางวัน เวลาเริ่มนับ OT
ช่องทางแจ้งเตือน	เปิด/ปิดอีเมลและ Teams
งานอัตโนมัติ · Outbox	กฎแจ้งเตือนรายวัน ประวัติการรัน ข้อความที่ส่ง Weekly report
Audit log	ใครเปลี่ยนอะไรเมื่อไร ค้นหาได้
ทีม DT และเป้า · Microsoft 365	โครงสร้างทีม เป้ายอดขาย และการเชื่อมต่อ M365

จัดการทีมและทีมย่อย

1. System Settings แท็บ **ทีมและทีมย่อย** — ค้นหาและกรองตามกลุ่ม
2. กด **เพิ่มทีมย่อย** กรอกรหัส (เปลี่ยนภายหลังไม่ได้) ชื่อ กลุ่ม ประเภท หัวหน้าทีม จำนวนคน และเป้ายอดขาย (ทีมขาย)
3. คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียด: ข้อมูลทีม สมาชิกในระบบ โครงการ และ **ประวัติการแก้ไข** (ใคร เมื่อไร เปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไร เหตุผล)
4. กด **แก้ไขข้อมูล** เพื่อแก้ หรือ **ปิดใช้งานทีม** (ต้องระบุเหตุผล) — ทีมที่ปิดเลือกให้โครงการใหม่ไม่ได้ แต่โครงการเดิมยังอยู่ครบ

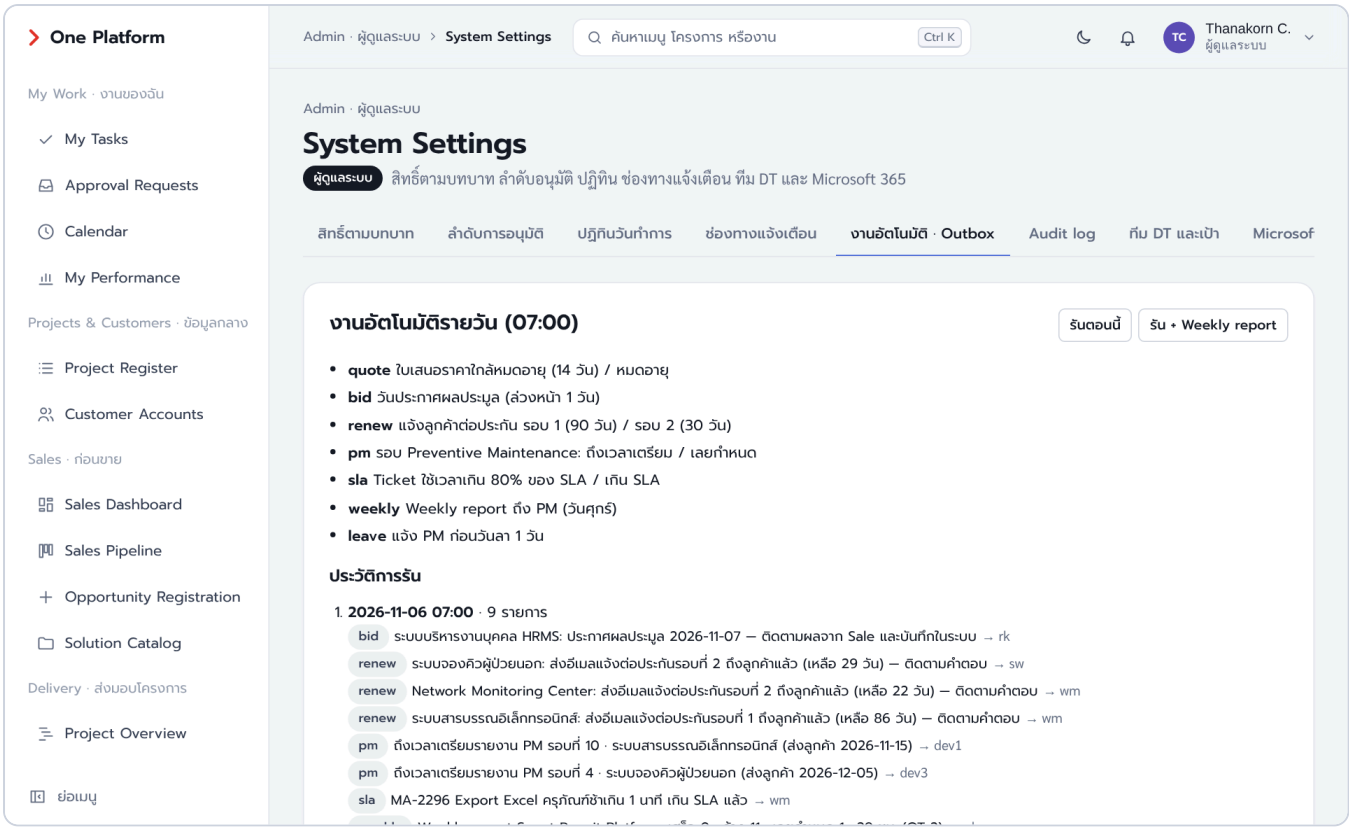

งานอัตโนมัติรายวันและ Outbox

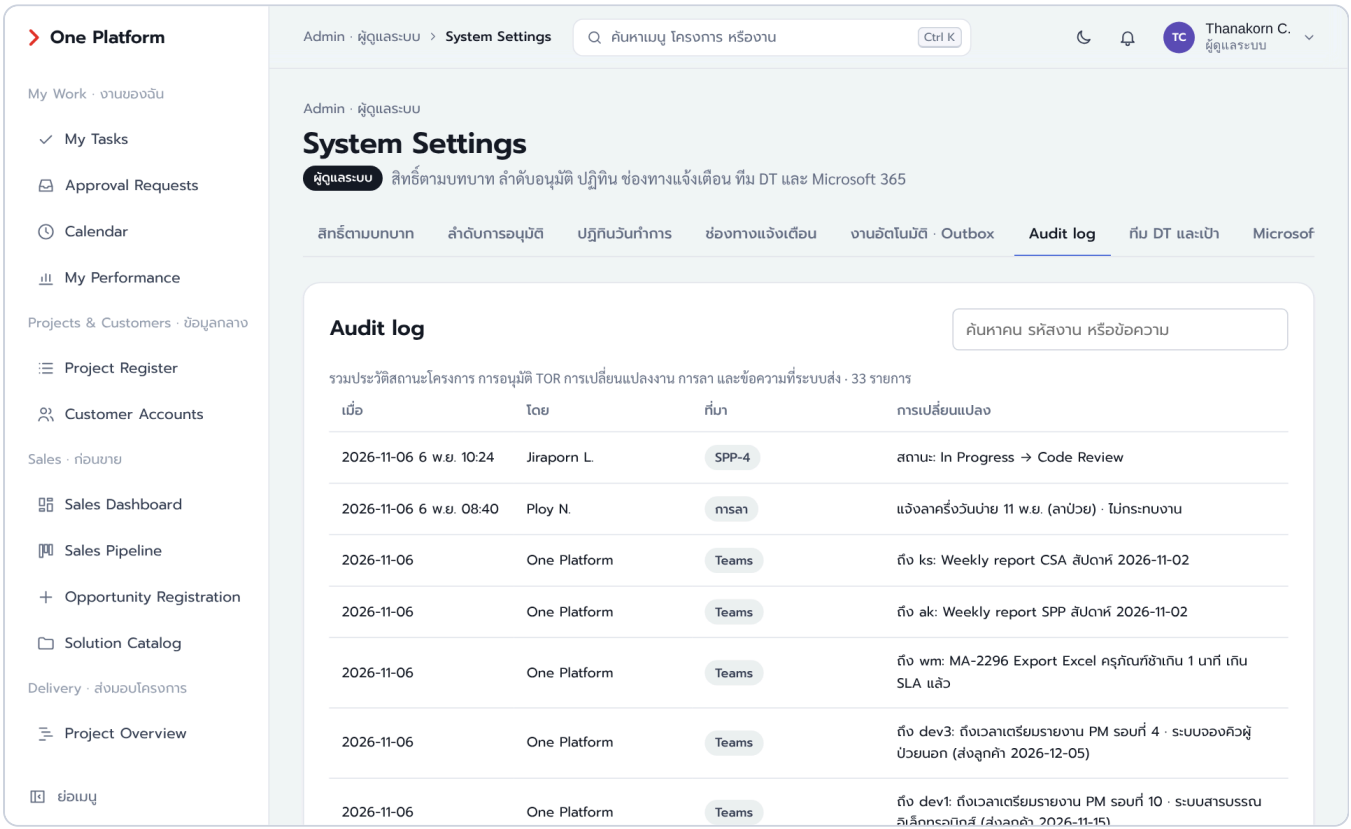

Audit log

13 ภาคผนวก

เมนูที่แต่ละบทบาทเห็น

บทบาท	เมนู
SM (Pre-sale)	SM Dashboard · Project Register (รายการ · Pipeline · ลงทะเบียนโครงการใหม่) · Solution Catalog · Calendar · Customer Accounts
หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าทีม Dev	SM Dashboard · Project Register (รายการ · Pipeline) · Solution Catalog · My Tasks · Approval Requests · Calendar · My Performance · Customer Accounts · Project Overview · Project Workspace · Resource Workload
รองผู้บริหาร / ผู้บริหาร DT	Executive Dashboard · Project Status Tracker · Mail Inbox · Calendar · Project Register
PMO (DT3-3)	My Tasks · Calendar · My Performance · Project Register · Project Overview · Project Workspace · Resource Workload
OPN (DT3-2)	My Tasks · Calendar · Project Register · Purchase Requisitions · Bank Guarantees
Project Manager	My Tasks · Calendar · My Performance · Project Register · Project Overview · Project Workspace · Resource Workload · Purchase Requisitions
ทีมพัฒนา	My Tasks · Calendar · My Performance · Project Workspace
ทีม MA	My Tasks · Calendar · Project Register · Customer Accounts · Warranty & Maintenance · Service Desk
Call center	My Tasks · Calendar · Service Desk
ผู้ดูแลระบบ	ทุกเมนู

บทบาทและหน้าแรก

บทบาท	หน้าแรก	งานหลัก
Solution Manager	SM Dashboard	ลงทะเบียน Requirement ราคา ขออนุมัติ บันทึกผล
หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าทีม Dev	SM Dashboard	ตรวจ TOR จัดคน ดูยอดทีม ยกเลิก/เปิดโครงการใหม่
รองผู้บริหาร	Mail Inbox	อนุมัติราคาขั้นแรก ติดตามทีมและโครงการ
ผู้บริหาร DT	Executive Dashboard	ดูทีมเทียบเป้า ติดตามสถานะโครงการ อนุมัติราคาขั้นสุดท้าย
PMO (DT3-3)	Project Overview	มอบหมาย PM Handover ติดตามทุกโครงการ

บทบาท	หน้าแรก	งานหลัก
OPN (DT3-2)	Purchase Requisitions	อนุมัติเบิกจ่าย หลักประกัน วางบิล
Project Manager	Project Workspace	วางแผน งวดงาน ทีม ความเสี่ยง OT
ทีมพัฒนา	My Tasks	ทำงาน บันทึกเวลา แจ้งลา รายงาน PM
ทีม MA	Warranty & Maintenance	รับมอบ รายงาน PM ต่อสัญญา
Call center	Service Desk	รับเรื่องและติดตาม SLA
ผู้ดูแลระบบ	System Settings	ตั้งค่าระบบ

คำถามที่พบบ่อย

ย้ายสถานะไม่ได้

ระบบจะแสดงรายการสิ่งที่ยังขาด เช่น ยังไม่มีใบเสนอราคาที่อนุมัติ หรือ TOR ยังไม่ผ่านหัวหน้า เติมให้ครบแล้วลองใหม่

ลากงานบนบอร์ดแล้วไม่ย้าย

Workflow ไม่อนุญาตข้ามขั้น หรือคอลัมน์ปลายทางเต็ม (WIP) หรือ Acceptance criteria ยังไม่ครบ — ข้อความเตือนจะบอกเหตุผล

ไม่เห็นปุ่มสร้างงาน

ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพื้นที่งาน หรือมีสิทธิ์ดูอย่างเดียว ติดต่อ PM ของโครงการ

ไม่เห็นราคาและต้นทุน

ทีมพัฒนาไม่เห็นข้อมูลราคาตามนโยบาย

หาโครงการไม่เจอ

กด Ctrl + K แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัส หรือเปิด Project Register แล้วค้นหา
